

Universidade Federal da Bahia  
Curso de Engenharia da Computação

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Salvador

2026


**José Raimundo Alves dos Santos Júnior**

**Título do trabalho**  
**Título do trabalho em inglês**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador(a) Prof. Dudu  
Coorientador(a) Carol

Salvador  
2026



4.0 Internacional

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho licenciado para fins não comerciais, com crédito atribuído ao autor. Os usuários não têm que licenciar os trabalhos derivados sob os mesmos termos estabelecidos pelo autor do trabalho original.

**José Raimundo Alves dos Santos Júnior**

## **Título do trabalho**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 30 de fevereiro de 2021:

---

**Prof. Dudu**  
UTFPR-TD  
Orientador(a)

---

**Prof. Josef Climber**  
UTFPR-TD

---

**Prof. Jhonny Epaminomdas**  
Unicamp

Salvador  
2026

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

## AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos...

*Hasta la vista, baby!*  
(Exterminador Cyberdyne Modelo T-800)

## RESUMO

Resumo aqui.

**Palavras-chave:** Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

## ABSTRACT

Abstract here.

**Keywords:** Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Exemplo de Figura . . . . .                                                                            | 13 |
| Figura 2 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco . . . . .                                  | 21 |
| Figura 3 – Métodos de simulação do Anylogic . . . . .                                                             | 29 |
| Figura 4 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse . . . . .                                                 | 30 |
| Figura 5 – Exemplo de Autômato . . . . .                                                                          | 33 |
| Figura 6 – Exemplo de Autômato Rotulador . . . . .                                                                | 35 |
| Figura 7 – Processo de modelagem . . . . .                                                                        | 38 |
| Figura 8 – Etapas gerais do processo de produção de paredes de concreto em um<br>edifício. . . . .                | 42 |
| Figura 9 – Atividades necessárias para um fluxo de trabalho adequado durante a<br>montagem e desmontagem. . . . . | 44 |
| Figura 10 – Estrutura da simulação utilizando DES. . . . .                                                        | 45 |
| Figura 11 – Estrutura da simulação utilizando ABM. . . . .                                                        | 46 |
| Figura 12 – Análise do modelo cognitivo. . . . .                                                                  | 47 |
| Figura 13 – Tempo médio observado de cada etapa . . . . .                                                         | 50 |
| Figura 14 – Questionário sobre fatores para omissões dos trabalhadores . . . . .                                  | 51 |
| Figura 15 – Estados do SED . . . . .                                                                              | 53 |
| Figura 16 – Eventos Observáveis ( $\Sigma_o$ ) e Eventos Não Observáveis ( $\Sigma_{uo}$ ). . . . .               | 54 |
| Figura 17 – Propriedades do Agente fôrma. . . . .                                                                 | 59 |
| Figura 18 – Propriedades da população de fôrmas. . . . .                                                          | 59 |
| Figura 19 – Propriedades do Agente trabalhador. . . . .                                                           | 60 |
| Figura 20 – Propriedades da população de trabalhadores. . . . .                                                   | 61 |
| Figura 21 – Representação geométrica do cômodo e blocos no ambiente do AnyLogic. . . . .                          | 62 |
| Figura 22 – Propriedades do <i>Transporter Fleet</i> com movimentação livre. . . . .                              | 63 |
| Figura 23 – Conexão dos blocos na lógica de montagem. . . . .                                                     | 64 |
| Figura 24 – Propriedades lógicas da função <i>chooseOutput</i> . . . . .                                          | 64 |
| Figura 25 – Propriedades do bloco de armazenagem <i>Store</i> . . . . .                                           | 65 |
| Figura 26 – Função <i>setDelay</i> . . . . .                                                                      | 66 |
| Figura 27 – Conexão dos blocos na lógica de desmontagem. . . . .                                                  | 66 |
| Figura 28 – Propriedades do bloco de desmonte <i>Retrieve</i> . . . . .                                           | 67 |
| Figura 29 – Variáveis para montagem e desmontagem. . . . .                                                        | 67 |
| Figura 30 – Diagrama de estados na ABM. . . . .                                                                   | 68 |
| Figura 31 – Eventos da ABM. . . . .                                                                               | 69 |
| Figura 32 – Propriedades dos turnos. . . . .                                                                      | 69 |
| Figura 33 – Propriedade do descanso <i>Break</i> . . . . .                                                        | 70 |

## SUMÁRIO

|           |                                                                       |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1         | CAPÍTULO, NÍVEL 1 . . . . .                                           | 10 |
| 1.1       | SEÇÃO, NÍVEL 2 . . . . .                                              | 10 |
| 1.1.1     | SUBSEÇÃO, NÍVEL 3 . . . . .                                           | 10 |
| 1.1.1.1   | SUBSEÇÃO, NÍVEL 4 . . . . .                                           | 10 |
| 1.1.1.1.1 | SUBSEÇÃO, NÍVEL 5 . . . . .                                           | 11 |
| 1.2       | SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS . . . . .                                | 11 |
| 1.3       | SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS . . . . .             | 12 |
| 1.4       | FIGURAS . . . . .                                                     | 13 |
| 1.5       | QUADROS E TABELAS . . . . .                                           | 13 |
| 1.6       | EQUAÇÕES . . . . .                                                    | 14 |
| 1.7       | SOBRE AS LISTAS . . . . .                                             | 14 |
| 1.7.1     | CITAÇÕES INDIRETAS . . . . .                                          | 16 |
| 1.7.2     | CITAÇÕES DIRETAS . . . . .                                            | 17 |
| 1.8       | SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . .                         | 18 |
| 1.9       | NOTAS DE RODAPÉ . . . . .                                             | 19 |
| 2         | INTRODUÇÃO . . . . .                                                  | 20 |
| 2.0.1     | Contexto da Pesquisa . . . . .                                        | 22 |
| 2.1       | Justificativa . . . . .                                               | 22 |
| 2.2       | Objetivos . . . . .                                                   | 23 |
| 2.3       | Organização do trabalho . . . . .                                     | 24 |
| 3         | REVISÃO DA LITERATURA . . . . .                                       | 25 |
| 3.1       | Gêmeo Digital . . . . .                                               | 25 |
| 3.2       | Simulação Híbrida . . . . .                                           | 26 |
| 3.2.1     | Simulação a Eventos Discretos (DES) . . . . .                         | 27 |
| 3.2.2     | Modelagem Baseada em Agentes (ABM) . . . . .                          | 27 |
| 3.3       | Ferramentas Computacionais . . . . .                                  | 28 |
| 3.3.1     | AnyLogic . . . . .                                                    | 28 |
| 3.3.2     | NVIDIA Omniverse . . . . .                                            | 29 |
| 3.4       | Sistemas a Eventos Discretos (SED) . . . . .                          | 30 |
| 3.4.1     | Estados e Eventos . . . . .                                           | 31 |
| 3.4.2     | Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas . . . . . | 31 |
| 3.4.3     | Linguagens . . . . .                                                  | 32 |
| 3.4.4     | Autômatos Finitos Determinísticos . . . . .                           | 33 |

|         |                                                                                               |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.5   | Diagnose Centralizada sob Observação Parcial . . . . .                                        | 34 |
| 3.4.5.1 | Autômato Rotulador ( $G_{al}$ ) . . . . .                                                     | 35 |
| 3.4.5.2 | Autômato Diagnosticador ( $G_d$ ) . . . . .                                                   | 35 |
| 3.4.6   | Diagnosticabilidade . . . . .                                                                 | 36 |
| 3.5     | Consideração do capítulo . . . . .                                                            | 37 |
| 4       | METODOLOGIA . . . . .                                                                         | 38 |
| 4.1     | Etapas de Desenvolvimento da Simulação Híbrida . . . . .                                      | 38 |
| 4.1.1   | Descrição do contexto da obra . . . . .                                                       | 41 |
| 4.1.2   | Etapas de Modelagem do Comportamento dos Trabalhadores . . . . .                              | 45 |
| 4.1.3   | Coleta de dados para definição dos fatores de influência, parâmetros e<br>variáveis . . . . . | 49 |
| 4.2     | SED . . . . .                                                                                 | 52 |
| 4.2.1   | Espaço de Estados ( $X$ ) e Estado Inicial ( $x_0$ ) . . . . .                                | 52 |
| 4.2.2   | Conjunto de Eventos ( $\Sigma$ ) e Conjunto de Eventos de Falhas ( $\Sigma_f$ ) . . . . .     | 53 |
| 4.2.3   | Função de Transição Parcial ( $f$ ) . . . . .                                                 | 56 |
| 4.2.4   | Arquitetura do Autômato Diagnosticador ( $G_d$ ) . . . . .                                    | 57 |
| 4.3     | Resultados e Discussão . . . . .                                                              | 58 |
| 4.3.1   | Simulação Híbrida no AnyLogic . . . . .                                                       | 58 |
| 4.3.1.1 | DES no AnyLogic . . . . .                                                                     | 62 |
| 4.3.1.2 | ABM no AnyLogic . . . . .                                                                     | 68 |
| 4.3.2   | Visualização no NVIDIA Omniverse . . . . .                                                    | 70 |
| 4.3.3   | Diagnóstico de Falhas por Sistemas a Eventos Discretos (SED) . . . . .                        | 70 |
| 4.3.4   | Autômato Gerador do Canteiro de Obras ( $G$ ) . . . . .                                       | 70 |
| 4.3.5   | Síntese do Autômato Diagnosticador ( $G_d$ ) . . . . .                                        | 70 |
| 4.3.6   | Análise de Diagnosticabilidade e Impactos na Gestão . . . . .                                 | 70 |
| 5       | DISCUSSÃO DOS RESULTADOS . . . . .                                                            | 71 |
| 6       | CONCLUSÃO . . . . .                                                                           | 72 |
| 6.1     | Limitações do Estudo . . . . .                                                                | 72 |
| 6.2     | Indicação de Trabalhos Futuros . . . . .                                                      | 72 |
|         | REFERÊNCIAS . . . . .                                                                         | 73 |
|         | APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE . . . . .                                                     | 76 |
|         | ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO . . . . .                                                           | 78 |

# 1 CAPÍTULO, NÍVEL 1

Toda seção deve conter um corpo de texto, obrigatoriamente. Insira um novo capítulo com o comando `\chapter{<título>}`, substituindo `<título>` pelo título do capítulo. Use o comando `label{<chave>}` logo após `\chapter{}` para utilizar referência cruzada. O Quadro 1 mostra um exemplo de código. Observação: se utilizar o sumário tradicional (veja a declaração `\documentclass[]{} no arquivo main.tex`) escreva o título capitalizado para garantir que os títulos fiquem em maiúsculo no sumário. Essa observação também é válida para seções e subseções.

**Quadro 1 – Exemplo de novo capítulo**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | <code>\chapter{Introdução}</code> |
| 2 | <code>\label{chap:intro}</code>   |
| 3 |                                   |
| 4 | <code>&lt;texto&gt;</code>        |

**Fonte: Autoria própria**

## 1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2

Essa é uma seção, nível 2, do Capítulo 1. Utilize o comando `\section{<título>}` para criar uma nova seção de nível 2. O Quadro 2 mostra um exemplo de código.

**Quadro 2 – Exemplo de nova seção de nível 2**

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | <code>\section{A vida da marmota}</code> |
| 2 | <code>\label{sec:marm}</code>            |
| 3 |                                          |
| 4 | <code>&lt;texto&gt;</code>               |

**Fonte: Autoria própria**

### 1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3

Essa é uma subseção, nível 3, da seção 1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 3. O Quadro 3 mostra um exemplo de código.

#### 1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4

Essa é uma subseção, nível 4, da subseção 1.1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 4. O Quadro 4 mostra um exemplo de código.

**Quadro 3 – Exemplo de nova seção de nível 3**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | <code>\subsection{Onde vivem}</code> |
| 2 | <code>\label{sec:viva}</code>        |
| 3 |                                      |
| 4 | <code>&lt;texto&gt;</code>           |

Fonte: Autoria própria

**Quadro 4 – Exemplo de nova seção de nível 4**

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | <code>\subsubsection{O que comem}</code> |
| 2 | <code>\label{sec:food}</code>            |
| 3 |                                          |
| 4 | <code>&lt;texto&gt;</code>               |

Fonte: Autoria própria

#### 1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5

Isso é uma subseção, nível 5, da subseção 1.1.1.1. Pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), subseções são permitidas até o nível 5 (ABNT, 2012). Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 5. O Quadro 5 mostra um exemplo de código.

**Quadro 5 – Exemplo de nova seção de nível 5**

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | <code>\subsubsubsection{Como se reproduzem}</code> |
| 2 | <code>\label{sec:sex}</code>                       |
| 3 |                                                    |
| 4 | <code>&lt;texto&gt;</code>                         |

Fonte: Autoria própria

## 1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS

Para acrescentar uma sigla ou acrônimo na lista de siglas e acrônimos utilize o comando `\nomenclature[A]{<sigla>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição da sigla ou do acrônimo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 6.

Para acrescentar um símbolo na lista de símbolos utilize o comando `\nomenclature[S]{<símbolo>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição do símbolo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 7.

Para que as listas sejam geradas é necessário que o comando *makeindex* seja executado com os seguintes argumentos:

**Quadro 6 – Exemplo de código para a acrescentar siglas ou acrônimos na lista**

| Código                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) \nomenclature[A]{OAB}{Ordem dos Advogados do Brasil} diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) \nomenclature[A]{STF}{Supremo Tribunal Federal}. |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                               |
| A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) .                                                                                                     |

Fonte: Autoria própria

**Quadro 7 – Exemplo de código para a acrescentar símbolos na lista**

| Código                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$ , onde $F_r$ \nomenclature[S]{ $F_r$ }{Força resultante} é a força resultante, $m$ \nomenclature[S]{ $m$ }{massa} é a massa e $a$ \nomenclature[S]{ $a$ }{aceleração} é a aceleração. |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                        |
| A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$ , onde $F_r$ é a força resultante, $m$ é a massa e $a$ é a aceleração.                                                                                                                |

Fonte: Autoria própria

makeindex -s nomencl.ist -o main.nls main.nlo

onde “main” é o nome do arquivo principal do projeto. Procure mais informações na base de dados do seu editor e compilador L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

### 1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS

A numeração sequencial de figuras, tabelas, quadros e equações ocorre de modo automático. As ilustrações (figuras), tabelas e quadros serão indexadas automaticamente em suas respectivas listas.


Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Sendo assim, não é necessário por exemplo, saber que o número de certo capítulo para colocar o seu número no texto. O comando `\autoref{}` facilita referência de elementos numerados no texto sem a necessidade de nomear o tipo do elemento.

Observe que este capítulo recebeu a chave “chap:nivel1” através do comando `\label{}` (`\label{chap:nivel1}`). Dessa forma, ao utilizar o código `\ref{chap:nivel1}` resulta na escrita do número do capítulo que nesse caso é “1”. De forma análoga, o comando `\autoref{chap:nivel1}` resulta em “Capítulo 1”.

## 1.4 FIGURAS

Esta seção trata de um exemplo de como inserir uma figura. Note que a Figura 1 aparece automaticamente na lista de figuras. Para saber mais sobre o uso de imagens no  $\text{\LaTeX}$  consulte literatura especializada (GOOSSENS et al., 2007).

**Figura 1 – Exemplo de Figura**

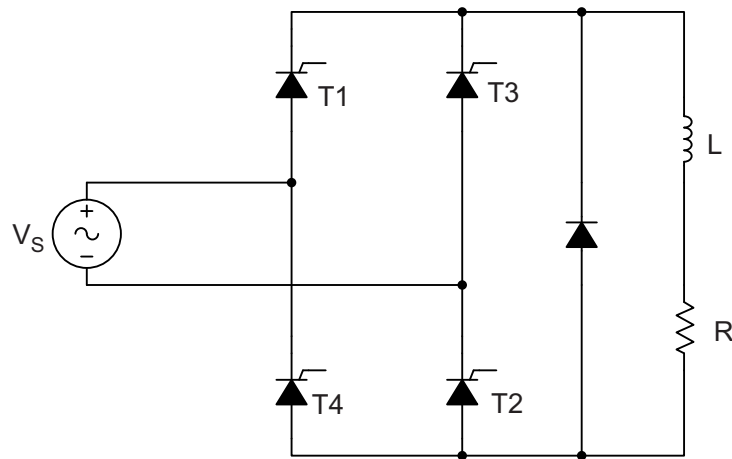

Fonte: Autoria Própria

O código utilizado para inserir a Figura 1 está listado no Quadro 8.

**Quadro 8 – Código exemplo utilizado para inserir a Figura 1**

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>\begin{figure}[!htb]</code>                                         |
| 2 | <code>\centering</code>                                                   |
| 3 | <code>\caption{Exemplo de Figura}</code>                                  |
| 4 | <code>\includegraphics[width=0.6\textwidth]{Caps/Figs/exemplo.eps}</code> |
| 5 | <code>\fonte{Autoria Própria}</code>                                      |
| 6 | <code>\label{fig:figura-exemplo1}</code>                                  |
| 7 | <code>\end{figure}</code>                                                 |

Fonte: Autoria própria

Utilize figuras no formato *Encapsulated PostScript* (EPS). Caso precise de outro formato, acrescente no preâmbulo deste modelo o pacote adequado para a sua necessidade.

## 1.5 QUADROS E TABELAS

Esta seção trata de exemplos de como inserir o Quadro 9 e a Tabela 1. Ambos aparecem automaticamente nas suas respectivas listas. Para saber mais informações sobre a construção de tabelas no  $\text{\LaTeX}$  consulte literatura especializada (MITTELBAACH et al., 2004).

A diferença entre quadro e tabela está no fato que um quadro é formado por linhas horizontais e verticais. Deve ser utilizado quando o conteúdo é majoritariamente não-numérico. O número do quadro e o título vem acima do quadro, e a fonte, deve vir

**Quadro 9 – Exemplo de Quadro**

| BD Relacionais                                                                                                                                                                                                           | BD Orientados a Objetos                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas podem ser automaticamente acionadas quando os dados são usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem com que os objetos executem seus métodos. | Os processos que usam dados mudam constantemente. |

**Fonte: Barbosa et al. (2004)**

abaixo. Uma tabela é formada apenas por linhas verticais. Deve ser utilizada quando o conteúdo é majoritariamente numérico. O número da tabela e o título vem acima da tabela, e a fonte, deve vir abaixo, tal como no quadro.

**Tabela 1 – Resultado dos testes**

|        | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Caso 1 | 0,86      | 0,77      | 0,81      | 163       |
| Caso 2 | 0,19      | 0,74      | 0,25      | 180       |
| Caso 3 | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 170       |

**Fonte: Barbosa et al. (2004)**

Os códigos para inserção do Quadro 9 e da Tabela 1 estão disponíveis nos Quadros 10 e 11.

## 1.6 EQUAÇÕES

Esta seção trata de exemplos de como inserir a Eq. (1) e a Eq. (2) no corpo do texto<sup>1</sup>. Observe que foram utilizadas duas formas distintas para referenciar as equações. Os códigos utilizados estão no Quadro 12.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (1)$$

$$F(u, v) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \exp \left[ -j2\pi \left( \frac{um}{M} + \frac{vn}{N} \right) \right] \quad (2)$$

## 1.7 SOBRE AS LISTAS

Exemplo de duas listas não numeradas aninhadas, utilizando o comando `\itemize`. Observe a indentação, bem como a mudança automática do tipo de "bullet" nas listas aninhadas.

<sup>1</sup> Deve-se atentar ao fato de a formatação das equações ficar ótima esteticamente.

Quadro 10 – Código exemplo utilizado para inserir o Quadro 9

```

\begin{quadro}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Quadro \label{qua:quadro-exemplo1}}
\begin{tabular}{|p{7cm}|p{7cm}|}
\hline
\textbf{BD Relacionais} & \textbf{BD Orientados a Objetos} \\
\hline
Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas
podem ser automaticamente acionadas quando os dados são
usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem
com que os objetos executem seus métodos. & Os processos
que usam dados mudam constantemente. \\
\hline
\end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{quadro}

```

Fonte: Autoria própria

Quadro 11 – Código exemplo utilizado para inserir a Tabela 1

```

\begin{table}[!htb]
\centering
\caption{Resultado dos testes}
\label{tab:tabela-exemplo1}
\begin{tabular}{rrrrr}
\toprule
& Valores 1 & Valores 2 & Valores 3 & Valores 4 \\
\midrule
Caso 1 & 0,86 & 0,77 & 0,81 & 163 \\
Caso 2 & 0,19 & 0,74 & 0,25 & 180 \\
Caso 3 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 170 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{table}

```

Fonte: Autoria própria

- item não numerado 1
- item não numerado 2

**Quadro 12 – Código exemplo utilizado para inserir as Equações (1) e (2)**

```

\begin{equation}
X(s) = \int\limits_{t = -\infty}^{\infty} x(t)\text{e}^{-st}dt
\label{eq:equacao-exemplo1}
\end{equation}

\begin{equation}
F(u, v) = \sum_{m = 0}^{M - 1} \sum_{n = 0}^{N - 1} f(m, n)
\exp \left[ -j 2 \pi \left( \frac{u m}{M} + \frac{v n}{N} \right) \right]
\label{eq:equacao-exemplo2}
\end{equation}

```

**Fonte: Autoria própria**

- subitem não numerado 1
- subitem não numerado 2
- subitem não numerado 3
- item não numerado 3

Exemplo de duas listas numeradas aninhadas, utilizando o comando `\enumerate`. Observe a numeração progressiva e indentação das listas aninhadas.

1. item numerado 1
2. item numerado 2
  - a) subitem numerado 1
  - b) subitem numerado 2
  - c) subitem numerado 3
3. item numerado 3

### 1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS

É a transcrição, com suas próprias palavras, das idéias de um autor, mantendo-se o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de duas maneiras distintas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do seu texto ou não. Exemplo de chamada fazendo parte do texto:

Enquanto Maturana e Varela (2003) defendem uma epistemologia baseada na biologia. Para os autores, é necessário rever ...

A chamada de referência foi feita com o comando `\citeonline{chave}`, que produzirá a formatação correta.

A segunda forma de fazer uma chamada de referência deve ser utilizada quando se quer evitar uma interrupção na sequência do texto, o que poderia, eventualmente, prejudicar a leitura. Assim, a citação é feita e imediatamente após a obra referenciada deve ser colocada entre parênteses. Porém, neste caso específico, o nome do autor deve vir em caixa alta, seguido do ano da publicação. Exemplo de chamada não fazendo parte do texto:

Há defensores da epistemologia baseada na biologia que argumentam em favor da necessidade de ... (MATURANA; VARELA, 2003).

Nesse caso a chamada de referência deve ser feita com o comando `\cite{chave}`, que produzirá a formatação correta.

### 1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado.

Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de qualquer das duas maneiras já mencionadas nas citações indiretas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do texto ou não. Há duas maneiras distintas de se fazer uma citação direta, conforme o trecho citado seja longo ou curto.

Quando o trecho citado é longo (4 ou mais linhas) deve-se usar um parágrafo específico para a citação, na forma de um texto recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de letra menor e espaçamento entrelinhas simples. Exemplo de citação longa:

Desse modo, opera-se uma ruptura decisiva entre a reflexividade filosófica, isto é a possibilidade do sujeito de pensar e de refletir, e a objetividade científica. Encontramo-nos num ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa (SILVA; SOUZA, 2000, p. 28).

Para fazer a citação longa deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
\begin{citacao}  
<texto da citacao>  
\end{citacao}
```

No exemplo, para a chamada da referência o comando `\cite[p.~28]{Silva2000}` foi utilizado, visto que os nomes dos autores não são parte do trecho citado. É necessário também indicar o número da página da obra citada que contém o trecho citado.

Quando o trecho citado é curto (3 ou menos linhas) ele deve inserido diretamente no texto entre aspas. Exemplos de citação curta:

A epistemologia parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar"(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35).

A epistemologia baseada na biologia de Maturana e Varela (2003, p. 35) parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar".

## 1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia é feita no padrão BIB<sub>TEX</sub>. As referências são colocadas em um arquivo separado. Neste template as referências são armazenadas no arquivo

“references.bib”.

Existem diversas categorias documentos e materiais componentes da bibliografia. A classe abn<sub>TEX</sub> define as seguintes categorias (entradas):

```
@book  
@inbook  
@article  
@phdthesis  
@mastersthesis  
@monography  
@techreport  
@manual  
@proceedings  
@inproceedings
```

@journalpart  
@booklet  
@patent  
@unpublished  
@misc

Cada categoria (entrada) é formatada pelo pacote abnTeX2 e Araujo (2014b) de uma forma específica. Algumas entradas foram introduzidas especificamente para atender à norma ABNT (2002), são elas: @monography, @journalpart, @patent. As demais entradas são padrão B<sub>I</sub>B<sub>T</sub>E<sub>X</sub>. Para maiores detalhes, refira-se a abnTeX2 e Araujo (2014b), abnTeX2 e Araujo (2014a), Araujo e abnTeX2 (2014).

## 1.9 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé pode ser classificadas em duas categorias: notas explicativas<sup>2</sup> e notas de referências. As notas de referências, como o próprio nome já indica, são utilizadas para colocar referências e/ou chamadas de referências sob certas condições.

---

<sup>2</sup> É o tipo mais comum de notas que destacam, explicam e/ou complementam o que foi dito no corpo do texto, como esta nota de rodapé, por exemplo.

## 2 INTRODUÇÃO

A Modelagem e Simulação Computacional representa um pilar na engenharia moderna. Ela consiste em uma abordagem analítica avançada que permite traduzir o comportamento do mundo real para um ambiente computacional controlado. Devido à sua capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza inerentes aos processos físicos, a simulação é considerada uma ferramenta eficaz de análise operacional (HALPIN; JEN; KIM, 2003).

No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (SICARD; GADSDEN, 2024). A Simulação a Eventos Discretos (DES) e a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) são abordagens fundamentais e complementares na simulação de sistemas. Enquanto a DES estrutura o modelo como um fluxo sequencial de processos e atividades cronologicamente ordenados, a ABM foca no comportamento descentralizado de entidades individuais autônomas (agentes) regidas por regras lógicas de decisão (MACAL; NORTH, 2009; BANKS et al., 2005).

Aliado ao conceito de simulação, uma definição importante é a de Gêmeos Digitais. Segundo American Institute of Aeronautics and Astronautics (2020), um Gêmeo Digital é definido como um conjunto de construções virtuais de informação que imita a estrutura, o contexto e o comportamento de um ativo físico individual ou de um grupo de ativos físicos, sendo atualizado dinamicamente com dados do seu gêmeo físico ao longo do seu ciclo de vida e servindo de base para decisões que geram valor.

Essas tecnologias têm potencial para solucionar problemas da construção civil, já que, segundo Oesterreich e Teuteberg (2016), a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada por variações, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (WAMBEKE; HSIANG; LIU, 2011). É justamente neste ponto que a criação de um modelo do canteiro de obras em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que se reflete em otimização de produção e redução de custos (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012).

É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida" e o "Casa Verde e Amarela" (ARAÚJO, 2025). O mé-

todo construtivo adotado para esse sistema se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de concreto armado de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012).

**Figura 2 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco**



**Fonte: Banco de imagens do GETEC**

Durante a produção, o fluxo de trabalho é intenso e os operários atuam em condições complexas, lidando com a constante montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). Consequentemente, a dificuldade de gestão manual frequentemente resulta em erros construtivos, defeitos nas formas, variabilidades na superfície do concreto e, consequentemente, retrabalhos. Tais distúrbios no processo construtivo configuram-se como falhas operacionais. Conforme estabelece Raman (2005), falha é um termo geral usado para descrever um distúrbio significativo que leva um processo para um ponto longe da sua faixa normal de operação, onde um sistema de controle não pode regular eficientemente o processo. Se esta situação não for corrigida por uma ação adequada, a operação pode entrar em uma situação emergencial que pode levar a consequências.

Para modelar essa dinâmica de forma rigorosa, pode ser adotada a perspectiva dos

Sistemas a Eventos Discretos (SED). Conforme define Nunes (2012), SED são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição de estados se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos. No contexto da construção, cada etapa para montagem e desmontagem das fôrmas representa um evento que altera o estado do sistema, permitindo que o fluxo construtivo seja tratado matematicamente através de autômatos finitos. Para mitigar os erros nessas etapas, será feito um estudo sobre detecção e diagnóstico de falhas.

Portanto, considerando o potencial do uso integrado de ferramentas tecnológicas e computacionais avançadas para solucionar problemas da construção civil, este trabalho adota Simulação Híbrida, Gêmeos Digitais e SED, aliados à teoria de diagnóstico de falhas, com o objetivo de modelar processos construtivos, modernizar a gestão da produção, detectar anomalias de forma antecipada e otimizar a alocação de recursos físicos no sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco.

### 2.0.1 Contexto da Pesquisa

A pesquisa desenvolvida neste Trabalho de Conclusão de Curso está inserida nas atividades do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GE-TEC), vinculado à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O trabalho foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa em nível de doutorado, conduzido por Araújo (2025), com foco no desenvolvimento de um sistema de Gêmeo Digital para gerenciamento e controle de recursos físicos em sistemas construtivos de parede de concreto. O presente estudo se integra como contribuição complementar. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, o atuei como bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI), auxiliando na pesquisa e desenvolvimento do trabalho, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

## 2.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo Cheng e Teizer (2013), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com Sicard e Gadsden (2024), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Como aponta Cheng e Teizer (2013), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (CHENG et al., 2012).

Ademais, há, também, o impacto direto das falhas operacionais no fluxo produtivo. Conforme afirma Kechida e Debbache (2005), cada falha ou defeito pode levar a paralisações ou uma ruptura do serviço e, conseqüentemente, a uma redução da produção da planta. No sistema de paredes de concreto, onde o ciclo de execução é extremamente rápido e repetitivo, a não detecção de uma inconsistência pode comprometer toda qualidade de produção do canteiro. Nesse contexto, a aplicação da diagnose de falhas torna-se um diferencial estratégico, pois, a detecção precoce e a correção de falhas podem ajudar a evitar as paradas dos sistemas e danos materiais (NUNES, 2012).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica, analítica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da diagnose de falhas em SEDs, com a Simulação híbrida como processo de criação de um Gêmeo Digital realista, fornece aos gestores uma ferramenta avançada de supervisão. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, capaz de identificar anomalias antes que estas resultem em desperdícios financeiros ou atrasos irreversíveis na execução de paredes de concreto.

## 2.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor uma Simulação Híbrida com DES e ABM, baseada nos princípios dos Gêmeos Digitais, para gestão e controle de recursos físicos do sistema construtivo de paredes de concreto, integrando técnicas de diagnose de falhas em SED, visando otimizar o fluxo de trabalho no canteiro de obras e aumentar a produtividade.

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um modelo computacional de Simulação Híbrida com DES e ABM utilizando a ferramenta AnyLogic;
- Modelar o fluxo operacional da montagem de fôrmas como um SED, implementando um diagnosticador para a detecção de falhas operacionais;
- Criar a representação visual contextualizada do canteiro, baseada nos princípios de Gêmeos Digitais, através do software NVIDIA Omniverse;
- Integrar os dados de simulação ao ambiente virtual para análise de cenários.

## 2.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta a introdução e contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 3 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e SED, com foco na teoria de diagnose de falhas em autômatos finitos, além de descrever as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da planta e do diagnosticador de falhas, a coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo ?? expõe o desenvolvimento e validação do modelo, a análise dos cenários simulados e os resultados da detecção de falhas operacionais através do diagnosticador implementado.

O Capítulo 5 faz a discussão sobre os impactos da integração das ferramentas na gestão do sistema construtivo de paredes de concreto e a eficácia da diagnose na redução de retrabalhos.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

## 3 REVISÃO DA LITERATURA

### 3.1 GÊMEO DIGITAL

O conceito de Gêmeos Digitais tem recebido considerável atenção acadêmica e industrial nas últimas duas décadas, consolidando-se como uma das principais tecnologias impulsionadoras da Indústria 4.0 (FULLER et al., 2020; LU et al., 2020). Laessgen e Stargel (2012) descrevem o Gêmeo Digital como uma simulação multifísica, multiescala e probabilística integrada de um sistema complexo. Segundo os autores, essa tecnologia utiliza os melhores modelos físicos disponíveis e atualizações contínuas de sensores para espelhar a vida de seu correspondente físico de forma fiel.

A ideia fundacional dessa tecnologia foi introduzida pública e formalmente em 2003 por Michael Grieves, na Universidade de Michigan (GRIEVES, 2014; TAO; ZHANG; NEE, 2019). Segundo Grieves (2014), a autoria do termo "Gêmeo Digital" pertence a John Vickers, da NASA, com quem Grieves colaborava na época. Em sua origem, as representações digitais possuíam um baixo nível de maturidade, frequentemente envolvendo a coleta manual e baseada em papel de informações do produto físico. Foi a partir da década seguinte, especialmente após 2010 e sob forte influência dos estudos da agência espacial americana, que o conceito experimentou uma evolução expressiva. O avanço das tecnologias da informação e a crescente disponibilidade de sensores físicos não destrutivos aumentaram de forma exponencial a quantidade, a riqueza e a fidelidade das informações (GRIEVES, 2014; TAO; ZHANG; NEE, 2019).

Inicialmente, a comunidade técnica interpretava o Gêmeo Digital apenas como um nível avançado de simulação tridimensional preliminar. Contudo, a literatura recente aponta que a simulação clássica é apenas um fragmento do ecossistema de um Gêmeo Digital. A principal característica que distancia o Gêmeo Digital da simulação computacional tradicional é a via de dados bidirecional e em tempo real (ADHIKARI et al., 2021). Enquanto modelos de simulação operam, na maioria das vezes, em ambientes estáticos e de forma *offline*, o Gêmeo Digital exige uma conexão de alta fidelidade com o ativo físico, refletindo seu estado atual dinamicamente.

Nesse sentido, a integração do Gêmeo Digital com todo o ciclo de vida do produto ou processo é considerada uma área de pesquisa promissora e em expansão (ADHIKARI et al., 2021). Um sistema fundamentado em Gêmeo Digital transcende a modelagem básica; ele engloba o monitoramento, a otimização e o controle do sistema real, demonstrando que um Gêmeo Digital é, em sua essência, muito mais do que apenas uma simulação.

Para além da sua definição conceitual, a arquitetura de um Gêmeo Digital é sustentada por núcleos fundamentais de funcionamento. Segundo Tao, Zhang e Nee (2019), um gêmeo digital opera através da interação estruturada de quatro elementos principais:

Modelos, Dados, Conexões e Serviços. Os modelos atuam como contrapartes digitais que acompanham o ativo físico, possuindo funções que variam desde a reprodução de comportamentos em alta fidelidade até a previsão autônoma de problemas no espaço físico. Os dados, originados tanto no ambiente físico quanto no virtual, são o motor que impulsiona o Gêmeo Digital, permitindo a sua operação contínua e em tempo real. As conexões estabelecem o fluxo integrado de informações e garantem a sincronia em circuito fechado entre os espaços. Por fim, os serviços encapsulam a complexidade do sistema, fornecendo as respostas através de interfaces acessíveis aos utilizadores.

### 3.2 SIMULAÇÃO HÍBRIDA

De acordo com Mustafee et al. (2015), a Simulação Híbrida é a aplicação conjunta de técnicas de forma integrada, onde ambas as abordagens aprimoram harmoniosamente as capacidades uma da outra e reduzem limitações através do compartilhamento de informações. Na prática, a Simulação Híbrida busca obter sinergia. Por exemplo, enquanto a DES é mais adequada para modelar questões de foco operacional, ela pode ser combinada com outras técnicas baseadas em agentes para abranger problemas complexos de ponta a ponta (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

No escopo do desenvolvimento de modelos, a Simulação Híbrida viabiliza a integração de métodos oriundos de diferentes disciplinas científicas, superando as barreiras entre a Pesquisa Operacional e a Ciência da Computação (MUSTAFEE et al., 2015). Nesse contexto, ganha destaque a combinação sinérgica entre a DES e a ABM. Essa integração torna-se estritamente necessária para a indústria da construção civil, uma vez que os projetos são altamente complexos e dinâmicos. Eles envolvem tanto o rigoroso fluxo logístico e sequencial das atividades e recursos (melhor representados pela DES) quanto o comportamento autônomo, interativo e estocástico dos operários no canteiro de obras (melhor representado pela ABM) (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Ao unir essas duas abordagens, a Simulação Híbrida permite capturar simultaneamente as restrições técnicas e os fatores humanos do sistema de maneira coesa.

Apesar da clara necessidade de lidar com essa complexidade mista, a aplicação da Simulação Híbrida na construção civil ainda se mantém esporádica, sendo implementada de forma mais pragmática do que sistemática (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Uma revisão recente aponta que apenas cerca de 9% das aplicações globais de Simulação Híbrida são direcionadas à construção (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Dada a ampla utilização da simulação tradicional na indústria, esse baixo nível de adoção de modelos híbridos torna imperativo o desenvolvimento de novas pesquisas e soluções tecnológicas integradas para o setor (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

### 3.2.1 Simulação a Eventos Discretos (DES)

Embora a nomenclatura seja semelhante, é fundamental não confundir a DES (Simulação a Eventos Discretos) com a teoria matemática de SED (Sistemas a Eventos Discretos), que será abordado nos próximos tópicos. Enquanto a formulação de SED foca na validação lógica e no sequenciamento formal de estados, a DES é amplamente utilizada na indústria e na academia como uma ferramenta computacional e analítica de apoio à decisão, capaz de simular a dinâmica de sistemas do mundo real evento por evento (BABULAK; WANG, 2010). Conforme destaca a literatura (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012), a DES é essencialmente quantitativa e com mudanças discretas, sendo a abordagem mais adequada para modelar questões de foco operacional, como o tempo de ciclo e a alocação de recursos. Na prática, o desempenho do sistema é estruturado na simulação como uma sequência cronológica ao longo do tempo, em que cada ocorrência representa uma mudança brusca de estado no sistema (ZAMANI; YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Em relação a seu desempenho, a DES provou ser uma ferramenta eficaz por permitir reproduzir as interações entre recursos e atividades em cenários que envolvem fluxos físicos de materiais e componentes, como aponta Babulak e Wang (2010). No contexto da execução de paredes de concreto, a abordagem orientada a eventos permite uma representação detalhada de fluxos de trabalho estritamente sequenciais, como a movimentação dos trabalhadores nas etapas de montagem e desmontagem. Ao lidar adequadamente com mudanças dinâmicas e incertezas temporais, a DES facilita o planejamento e a tomada de decisão gerencial por meio da análise iterativa de cenários (ZAMANI; YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Contudo, a aplicação isolada da DES na construção civil apresenta gargalos operacionais. Segundo Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), as simulações baseadas em eventos discretos possuem limitações significativas de visualização, uma vez que os softwares comerciais carecem das ferramentas visuais extensivas exigidas na gestão do canteiro de obras. Para superar essa limitação, uma solução plausível é a integração da DES com plataformas de representação visual.

### 3.2.2 Modelagem Baseada em Agentes (ABM)

A Modelagem Baseada em Agentes (ABM), assim como a DES, também atua sob a perspectiva de sistemas discretos, mas configura-se como uma abordagem computacional focada em entidades descentralizadas, sendo altamente adequada para os ciclos de monitoramento e controle em Gêmeos Digitais na construção (SACKS et al., 2020). De acordo com Bianchi e Squazzoni (2015), a ABM simula a interação entre agentes heterogêneos inseridos em estruturas sociais complexas, como é o caso de um canteiro de obras.

Sendo uma abordagem relativamente nova para observar efeitos coletivos, a premissa central dessa técnica é que padrões globais emergem a partir de regras locais, sem que

o comportamento final seja explicitamente programado (MUSTAFEE et al., 2015). Para estruturar essa modelagem, (MACAL; NORTH, 2005) definem três elementos constituintes de um ABM típico: (1) os agentes, dotados de atributos e comportamentos próprios; (2) os métodos de relacionamento e interação entre os agentes; e (3) a interação do agente com o seu ambiente.


Enquanto a DES gerencia a fila e os recursos logísticos, a ABM foca no indivíduo (MUSTAFEE et al., 2015). Em um canteiro de obras, a ABM permite representar os operários como agentes inteligentes com regras próprias de decisão e movimentação. Isso possibilita capturar as variabilidades humanas, o estresse e a maneira como as equipes interagem com as fôrmas, com o espaço físico reduzido e com outros trabalhadores, gerando uma representação computacional muito mais fiel da natureza imprevisível e dinâmica do trabalho manual nas obras (MUSTAFEE et al., 2015).

### **3.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS**

A implementação de uma arquitetura de Gêmeo Digital baseada em Simulação Híbrida e Diagnóstico de Falhas exige a integração de plataformas de software robustas. Nesta seção, descrevem-se as principais ferramentas selecionadas para compor o ecossistema tecnológico deste trabalho, justificando suas adoções com base na literatura e nos requisitos do projeto.

#### **3.3.1 AnyLogic**

O AnyLogic é reconhecido como a ferramenta pioneira na modelagem e simulação multimétodo, permitindo o desenvolvimento de modelos por meio da integração dos três principais métodos modernos de simulação: DES, ABM e Dinâmica de Sistemas (SD) (AnyLogic, 2026).

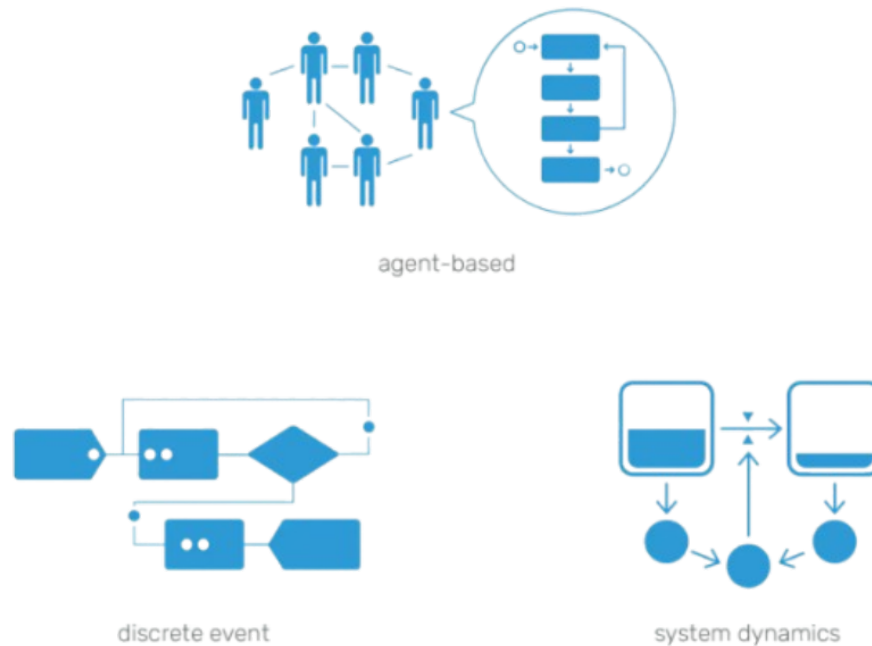**Figura 3 – Métodos de simulação do Anylogic**

**Fonte: AnyLogic (2026)**

Segundo AnyLogic (2026), esses métodos podem ser utilizados em qualquer combinação dentro de um único software, capacitando a plataforma a simular sistemas operacionais e de negócios de qualquer nível de complexidade, o que a torna uma base flexível e robusta para o desenvolvimento e experimentação de Gêmeos Digitais. Além disso, a ferramenta se destaca por oferecer diversas linguagens de modelagem visual, incluindo fluxogramas de processo, diagramas de estoque e fluxo, gráficos de ação e gráficos de estado (statecharts).

No escopo da construção civil, a escolha dessa ferramenta é amplamente respaldada pela literatura acadêmica. De acordo com a recente revisão conduzida por Fakhimi, Mustafee e Eldabi (2023), o AnyLogic desponta como o software mais utilizado globalmente para a construção de modelos de Simulação Híbrida no setor, estando presente em grande parte dos estudos documentados na área. Além de facilitar a automação integrada entre diferentes pacotes, a ferramenta apresenta um alto nível de validação e verificação, sendo amplamente alimentada por dados do mundo real em projetos de construção (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).


Neste trabalho, o AnyLogic será a parte analítica do sistema. Ele será responsável não apenas por rodar a simulação logística das fôrmas (DES) e o comportamento dos operários (ABM), mas também por abrigar a lógica customizada dos Autômatos.

### 3.3.2 NVIDIA Omniverse

O NVIDIA Omniverse é uma coleção de bibliotecas e microserviços voltada para o desenvolvimento de aplicações, como gêmeos digitais industriais e simulações complexas

(NVIDIA, 2026). Aproveitando a expertise da NVIDIA em computação acelerada, a plataforma integra funcionalidades avançadas, como bibliotecas de cálculo estrutural (NVIDIA PhysX) e renderização baseada em física e em tempo real (NVIDIA RTX). Fundamentado no padrão OpenUSD (Universal Scene Description), o Omniverse permite a interoperabilidade perfeita de dados e a colaboração em tempo real, viabilizando a criação de gêmeos digitais prontos para simulação.

**Figura 4 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse**

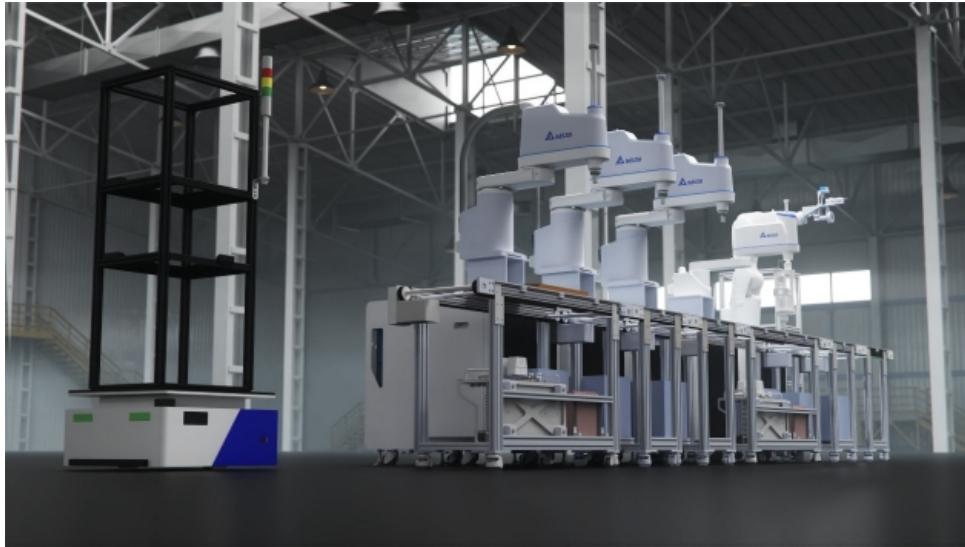

**Fonte: NVIDIA (2026)**

Conforme discutido anteriormente com base em Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), os softwares comerciais voltados para simulação apresentam limitações significativas de visualização, carecendo das ferramentas gráficas e espaciais extensivas exigidas na gestão prática de um canteiro de obras. Sendo assim, o Omniverse foi selecionado para preencher exatamente essa lacuna tecnológica. Neste projeto, o Omniverse atuará como a interface de visualização do Gêmeo Digital. Ele receberá os dados processados gerados em tempo real pelo AnyLogic, traduzindo essas informações analíticas em uma representação geométrica tridimensional e interativa do canteiro.

### **3.4 SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS (SED)**

Os SED são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos (BASILIO et al., 2010). O fato de o estado do sistema ser discreto implica que este pode assumir valores simbólicos, como por exemplo {ligado, desligado}, ou valores numéricos pertencentes a conjuntos discretos (como  $\mathbb{N}$  ou  $\mathbb{Z}$ ). Os eventos, por sua vez, podem estar associados a ações específicas iniciadas por agentes ou ser o resultado do cumprimento de diversas condições lógicas ou físicas (BASILIO et al., 2010).

Embora seja possível modelar praticamente qualquer sistema físico como um SED, dependendo do grau de abstração adotado, determinados ambientes operacionais são naturalmente discretos e têm sua evolução determinada estritamente pela ocorrência de eventos (NUNES, 2012). Nesse sentido, as etapas de trabalho em um canteiro de obras enquadram-se perfeitamente nesse paradigma, uma vez que o avanço físico da montagem ou desmontagem de formas dependem de transições pontuais e sequenciais do processo de construção.

Ao se considerar a evolução de um SED, a maior preocupação da modelagem reside na sequência de estados visitados e nos eventos que causaram as correspondentes transições (NUNES, 2012). Conforme fundamentado pela teoria clássica de (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008), o modelo formal de um SED é composto basicamente por esses dois elementos fundamentais: estados e eventos.

### 3.4.1 Estados e Eventos

O estado de um sistema num instante deve descrever o seu comportamento nesse instante de alguma forma mensurável (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Ele funciona como a memória do sistema naquele momento, assumindo valores discretos e simbólicos. No contexto de um canteiro de obras, cada processo da montagem ou desmontagem de uma forma pode ser definido como um estado.

Os eventos, por sua vez, são as ocorrências instantâneas responsáveis por causar a transição do sistema de um estado para outro (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Um evento pode estar associado a uma ação específica iniciada por um agente ou ser o resultado do cumprimento de uma condição física no sistema. A evolução de um SED é ditada estritamente pela sequência em que esses eventos ocorrem (BASILIO et al., 2010).

### 3.4.2 Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas

Para que seja possível aplicar a teoria de SED na identificação de problemas reais, é necessário classificar os eventos do sistema de acordo com a sua capacidade de serem registados. Segundo Basilio et al. (2010), a diagnose de falhas em SEDs é norteadas por dois paradigmas centrais:

1. As falhas a serem diagnosticadas são inerentemente Eventos Não Observáveis, isto é, são ocorrências que não podem ser diretamente registadas por sensores físicos ou por apontamentos diretos no canteiro de obras;
2. A ocorrência de uma falha altera o comportamento do sistema, porém não leva necessariamente à sua paragem imediata. Por exemplo, a ocorrência de uma falha não diagnosticada em um processo de manufatura ou construção civil pode levar apenas a uma degradação invisível dos indicadores de eficácia global, como atrasos logísticos ou queda de qualidade (BASILIO et al., 2010).

Dessa forma, o problema da diagnose de falhas consiste em inferir a ocorrência de um evento de falha não observável baseando-se exclusivamente no histórico dos eventos regulares que foram Observáveis. De maneira informal, diz-se que um evento de falha pode ser diagnosticado se a sua ocorrência puder ser detetada com exatidão após a ocorrência de um número finito de Eventos Observáveis subsequentes (BASILIO et al., 2010).

Para atingir esse objetivo, constroem-se sistemas de diagnose de falhas atuando como "sensores virtuais". O projeto destes sistemas requer a construção prévia de um modelo a eventos discretos que capture tanto o comportamento normal quanto o comportamento falho do sistema (BASILIO et al., 2010).

### 3.4.3 Linguagens

Embora os conceitos de estados e eventos determinem a natureza de um SED, a modelagem rigorosa e o estudo do comportamento desse sistema exigem uma base matemática sólida. Um dos caminhos formais mais utilizados para essa finalidade fundamenta-se na teoria de linguagens e autômatos (NUNES, 2012).

O ponto de partida dessa formulação é a definição do conjunto de todos os eventos possíveis no sistema, tipicamente denotado por  $\Sigma$ . Neste contexto formal, o conjunto de eventos  $\Sigma$  atua como o "alfabeto" da linguagem, enquanto uma sequência finita de eventos executada pelo sistema é tratada como uma "palavra" (NUNES, 2012).

Considerando que  $\Sigma$  seja um conjunto finito, o comprimento de uma palavra, ou seja, o número de eventos contidos nela, é denotado por  $|s|$ , onde  $s$  representa a palavra em questão. Destaca-se também a existência fundamental de uma palavra que não contém nenhum evento, denominada "palavra vazia" e classicamente denotada pelo símbolo  $\varepsilon$ . A operação matemática chave para a construção dessas sequências é a concatenação, onde a palavra vazia  $\varepsilon$  atua como o elemento identidade (NUNES, 2012).

$$\varepsilon s = s\varepsilon = s \quad (3)$$

Para mapear todas as possibilidades do sistema, define-se  $\Sigma^*$  como o conjunto de todas as sequências finitas que podem ser formadas a partir do alfabeto  $\Sigma$ , incluindo a palavra vazia  $\varepsilon$ . Dessa forma, define-se formalmente o conceito de linguagem em um SED: uma linguagem  $L$  é simplesmente um subconjunto de  $\Sigma^*$  ( $L \subseteq \Sigma^*$ ), formada exclusivamente por sequências de eventos que o sistema é fisicamente ou logicamente capaz de executar.

No formalismo de SED, um autômato atua como o dispositivo matemático capaz de representar e gerar essa linguagem de acordo com regras lógicas de transição (BASILIO et al., 2010). Para que o sistema processe as palavras, a função de transição de estados  $f$  é estendida recursivamente para lidar com palavras inteiras pertencentes a  $\Sigma^*$ :

$$f(x, \varepsilon) := x \quad (4)$$

$$f(x, se) := f(f(x, s), e) \quad \text{para } s \in \Sigma^* \text{ e } e \in \Sigma \quad (5)$$


Essa formulação garante que a leitura da palavra vazia  $\varepsilon$  mantenha o sistema no mesmo estado, enquanto a leitura de uma palavra composta *se* consiste em processar primeiro a sequência  $s$  e, em seguida, aplicar a transição referente ao último evento  $e$  (BASILIO et al., 2010).

A totalidade dos caminhos que podem ser seguidos no sistema, partindo do seu estado inicial  $x_0$ , caracteriza a sua linguagem gerada. Para o escopo de monitoramento e diagnose de falhas, uma propriedade fundamental dessa linguagem é que ela é estritamente **\*\*prefixo-fechada\*\*** (BASILIO et al., 2010). Na prática de um canteiro de obras, isso significa que se uma determinada sequência de eventos (normal ou de falha) é capaz de ser executada e pertence à linguagem do sistema, obrigatoriamente todos os eventos intermediários que a precederam (seus prefixos) também ocorreram e pertencem à linguagem.

### 3.4.4 Autômatos Finitos Determinísticos

Uma das maneiras mais eficientes e rigorosas de se modelar e visualizar um Sistema a Eventos Discretos é através de Autômatos Finitos Determinísticos. Um autômato é um dispositivo matemático capaz de representar a linguagem de um sistema de acordo com regras bem definidas, sendo frequentemente ilustrado por diagramas de transição de estados (BASILIO et al., 2010).

**Figura 5 – Exemplo de Autômato**

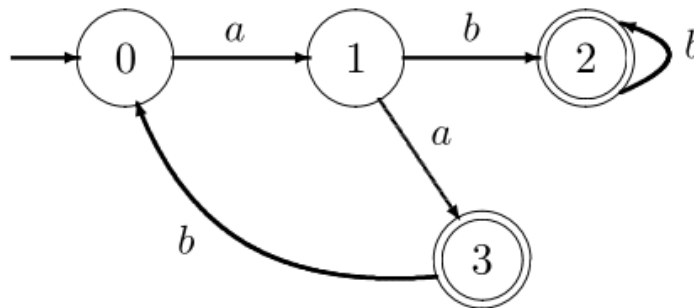

Fonte: Basilio et al. (2010)

Formalmente, um autômato determinístico é definido pela quintupla:

$$G = (X, \Sigma, f, x_0, X_m) \quad (6)$$

onde:

- $X$  é o conjunto finito de estados do sistema;
- $\Sigma$  é o conjunto finito de eventos (alfabeto);
- $f : X \times \Sigma \rightarrow X$  é a função de transição parcial, que define o novo estado do sistema após a ocorrência de um evento;

- $x_0 \in X$  é o estado inicial do sistema;
- $X_m \subseteq X$  é o subconjunto de estados marcados (geralmente associados à conclusão de tarefas ou ciclos operacionais).

Para complementar a dinâmica do modelo, define-se  $\Gamma(x) \subseteq \Sigma$  como o conjunto de eventos ativos no estado  $x$ , ou seja, o subconjunto de eventos que estão fisicamente ou logicamente habilitados a ocorrer quando o sistema se encontra naquele estado específico.

Para que seja possível aplicar a teoria de diagnose de falhas sobre o modelo  $G$ , a literatura clássica estabelece três premissas fundamentais que o sistema deve respeitar (BASILIO et al., 2010). No contexto da modelagem logística de um canteiro de obras, essas hipóteses traduzem-se da seguinte forma:

1. **A1 - Sistema Vivo** ( $\Gamma(x) \neq \emptyset$  para todo  $x \in X$ ): Assume-se que o autômato gerado por  $G$  não possui estados de travamento irreversível (deadlocks). Na prática, isso significa que a obra está em contínua operação; mesmo que ocorra uma falha logística ou um atraso, o sistema sempre terá algum evento possível para dar sequência ao processo.
2. **A2 - Ausência de ciclos não Observáveis**: O modelo não pode possuir nenhum ciclo de estados formado exclusivamente por Eventos Não Observáveis. Essa hipótese garante que, caso uma falha oculta ocorra, o sistema não ficará preso em um *loop* invisível aos sensores. O processo de construção continuará avançando até gerar um evento observável, permitindo que o Gêmeo Digital detecte a falha pregressa.
3. **A3 - Único tipo de falha** ( $\Sigma_f = \{\sigma_f\}$ ): Embora tutoriais clássicos muitas vezes assumam um único tipo de falha por simplicidade didática, a teoria permite a modelagem de múltiplos eventos anômalos. Para isso, o conjunto de falhas  $\Sigma_f$  é particionado em  $m$  classes disjuntas. No escopo deste trabalho, o sistema contemplará diferentes tipos de falha (como, por exemplo, problemas na montagem ou atrasos na concretagem), sendo os fundamentos de diagnosticabilidade aplicados para identificar a ocorrência de cada classe de falha de maneira independente.

### 3.4.5 Diagnose Centralizada sob Observação Parcial

A essência da diagnose de falhas em um SED reside na capacidade de inferir a ocorrência de Eventos Não Observáveis a partir da sequência de Eventos Observáveis gerada pelo sistema. Para formalizar essa restrição de visibilidade, define-se o conjunto de eventos do sistema como a união disjunta  $\Sigma = \Sigma_o \cup \Sigma_{uo}$ , onde  $\Sigma_o$  representa os Eventos Observáveis (registrados pelos sensores ou apontamentos no canteiro) e  $\Sigma_{uo}$  os Eventos Não Observáveis (que incluem o subconjunto de eventos de falha  $\Sigma_f$ ).

A relação entre o que o sistema efetivamente executa e o que o observador capta é matematicamente descrita pela função de Projeção  $P_o : \Sigma^* \rightarrow \Sigma_o^*$ . Essa função atua


"apagando" os eventos não observáveis de uma sequência, mantendo intacto apenas o rastro visível da operação (BASILIO et al., 2010).

Para que a tomada de decisão sobre a ocorrência ou não de uma falha seja realizada por um único agente analítico, utiliza-se a abordagem de diagnose centralizada. O projeto desse agente é dividido metodologicamente em duas etapas de modelagem: o Autômato Rotulador ( $G_{al}$ ) e o Autômato Diagnosticador ( $G_d$ ).

#### 3.4.5.1 Autômato Rotulador ( $G_{al}$ )

Para rastrear o impacto das falhas ao longo das transições do sistema, o primeiro passo consiste na construção de um Autômato Rotulador ( $G_{al}$ ). Este autômato expande o modelo original  $G$ , acoplando ao estado físico do sistema uma "etiqueta" (ou rótulo) que indica a ocorrência de anomalias. Define-se o conjunto de rótulos  $\Delta = \{N, F_1, F_2\}$ , onde  $N$  indica o comportamento Normal, enquanto  $F_1$  e  $F_2$  indicam a ocorrência pregressa das respectivas classes de falha modeladas na obra.

**Figura 6 – Exemplo de Autômato Rotulador**



Fonte: Basilio et al. (2010)

Dessa forma, os estados do autômato rotulador assumem a forma de pares ordenados  $(x, l)$ , onde  $x \in X$  é o estado da planta e  $l \in \Delta$  é a condição de falha associada. O  $G_{al}$  processa todos os eventos (Observáveis e Não Observáveis). Quando um evento de falha ocorre, o autômato altera o rótulo de  $N$  para  $F_i$  e propaga essa etiqueta para todos os estados subsequentes, funcionando como uma memória permanente de que o sistema foi corrompido.

#### 3.4.5.2 Autômato Diagnosticador ( $G_d$ )

Na prática, o sistema de monitoramento não tem acesso direto aos estados e eventos internos do  $G_{al}$ , uma vez que está submetido à observação parcial ( $P_o$ ). Para superar essa limitação, constrói-se o Autômato Diagnosticador Centralizado ( $G_d$ ). O diagnosticador é, essencialmente, um observador determinístico construído a partir do  $G_{al}$ , cuja função de transição é acionada exclusivamente pela ocorrência de Eventos Observáveis ( $\Sigma_o$ ) (BASILIO et al., 2010).

Devido à ausência de informações completas, cada estado  $q$  do diagnosticador  $G_d$  é composto por um conjunto de estimativas de estado do rotulador, assumindo a forma

$q = \{(x_1, l_1), (x_2, l_2), \dots, (x_n, l_n)\}$ . Baseando-se nas etiquetas contidas no estado atual  $q$ , o diagnosticador classifica a condição operacional do sistema em três categorias principais:

- **Normal:** Todos os pares no estado  $q$  possuem o rótulo  $N$ . O sistema opera sem indícios de falhas.
- **Incerteza:** O estado  $q$  contém simultaneamente pares com o rótulo  $N$  e pares com rótulos de falha ( $F_1$  ou  $F_2$ ). O sistema suspeita de uma anomalia (pois um caminho falho é possível), mas requer a observação de eventos futuros para confirmar o diagnóstico.
- **Falha Diagnosticada (Certeza):** Todos os pares no estado  $q$  possuem o mesmo rótulo de falha (ex:  $F_1$ ). Neste momento, independentemente do caminho oculto que o sistema tomou, a falha é matematicamente certa.

No escopo do Gêmeo Digital proposto, o AnyLogic atuará como o motor de execução deste diagnosticador centralizado ( $G_d$ ). Ao receber os *inputs* observáveis do avanço logístico das fôrmas, o autômato processará as transições e calculará as estimativas de estado  $q$  em tempo real. Caso o diagnóstico atinja um estado de Certeza de Falha, a plataforma acionará um alerta visual integrado, garantindo uma resposta preditiva por parte da gestão da obra.

### 3.4.6 Diagnosticabilidade

A construção de um Autômato Diagnosticador ( $G_d$ ) não garante, por si só, que todas as anomalias do sistema serão invariavelmente identificadas. Para que o monitoramento seja efetivo e o sensor virtual funcione, a linguagem gerada pelo sistema deve possuir uma propriedade fundamental denominada Diagnosticabilidade (BASILIO et al., 2010).

De maneira informal, diz-se que a linguagem gerada por um autômato é Diagnosticável em relação a um conjunto de Eventos Observáveis  $\Sigma_o$  e a uma classe de falhas  $\Sigma_f$  se a ocorrência de um evento de falha puder ser detectada com exatidão após um número finito de transições subsequentes, utilizando exclusivamente a leitura das sequências de Eventos Observáveis (BASILIO et al., 2010).

Na prática da modelagem de um canteiro de obras, isso significa que, após a ocorrência de uma anomalia oculta, o processo logístico deve obrigatoriamente continuar avançando e gerando eventos visíveis suficientes para que o Gêmeo Digital deduza a falha pregressa. O sucesso desse processo ocorre quando o autômato diagnosticador consegue sair de um estado de "Incerteza" e transitar definitivamente para um estado de "Certeza de Falha".

Por outro lado, um sistema é classificado como Não Diagnosticável quando existe a possibilidade de o diagnosticador ficar preso indefinidamente em estados de incerteza. Matematicamente, isso ocorre quando o modelo da planta possui ciclos de eventos que geram exatamente a mesma projeção observável tanto para um comportamento normal

quanto para um comportamento falho. Diante dessa ambiguidade permanente, o sistema analítico torna-se incapaz de confirmar a ocorrência da anomalia, independentemente de quanto tempo o monitoramento continue. Nesses casos, a teoria de controle indica que o projeto do sistema deve ser revisto, seja adicionando novos sensores ou alterando a lógica do processo, para que a falha se torne detectável.

### 3.5 CONSIDERAÇÃO DO CAPÍTULO

A compreensão do canteiro de obras, a análise do comportamento humano por meio da ABM e o fluxo físico da construção da parede de concreto realizada pela DES evidenciam uma realidade crítica: as decisões diárias dos trabalhadores são a causa raiz de diversos defeitos construtivos nas paredes de concreto. Essa dinâmica comportamental gera uma necessidade constante de retrabalho, o que compromete severamente a produtividade global e o planejamento da obra. A não execução de qualquer atividade essencial resulta, portanto, na consolidação de uma não conformidade.

Contudo, a simples observação física ou o uso de formulários de verificação tradicionais não são suficientes para capturar essas infrações, uma vez que elas ocorrem, na maioria das vezes, de forma silenciosa. O trabalhador burla os mecanismos de controle sem deixar rastros imediatos, o que faz com que esses erros se comportem, na ótica da simulação, como Eventos de Falha Não Observáveis.

É exatamente para solucionar essa lacuna de rastreabilidade percebida pela Simulação Híbrida que surge a necessidade da aplicação da teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED), cujo arcabouço lógico será detalhado nos próximos capítulos. O estudo do SED é uma alternativa para este trabalho porque permite avançar da simples constatação do problema para o diagnóstico formal. O mapeamento das atividades do canteiro servirá como base para a construção de um modelo capaz de rastrear o fluxo visível (Observável) da obra e inferir, matematicamente, a ocorrência dessas anomalias ocultas, conectando o comportamento operário à detecção analítica de falhas no processo produtivo.


## 4 METODOLOGIA

### 4.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO HÍBRIDA

Esta seção detalha as etapas de desenvolvimento computacional da Simulação Híbrida, desenvolvida como um componente de Gêmeo Digital. De forma geral, a DES é empregada para representar as etapas macro do processo, sendo a abordagem mais adequada para modelar o fluxo sequencial do canteiro de obras e as mudanças de estado à medida que as atividades progridem. Em paralelo, a ABM atua no nível micro, sendo responsável por representar o processo de tomada de decisão, a movimentação e os padrões de comportamento dos trabalhadores frente aos eventos da obra.

No contexto deste estudo, essas duas abordagens (DES e ABM) operam de forma integrada e simultânea dentro de uma mesma plataforma de desenvolvimento (AnyLogic). O ciclo de construção deste modelo híbrido segue a estrutura metodológica descrita na Figura 7, fundamentada nos conceitos de Crooks et al. (2019).

**Figura 7 – Processo de modelagem**

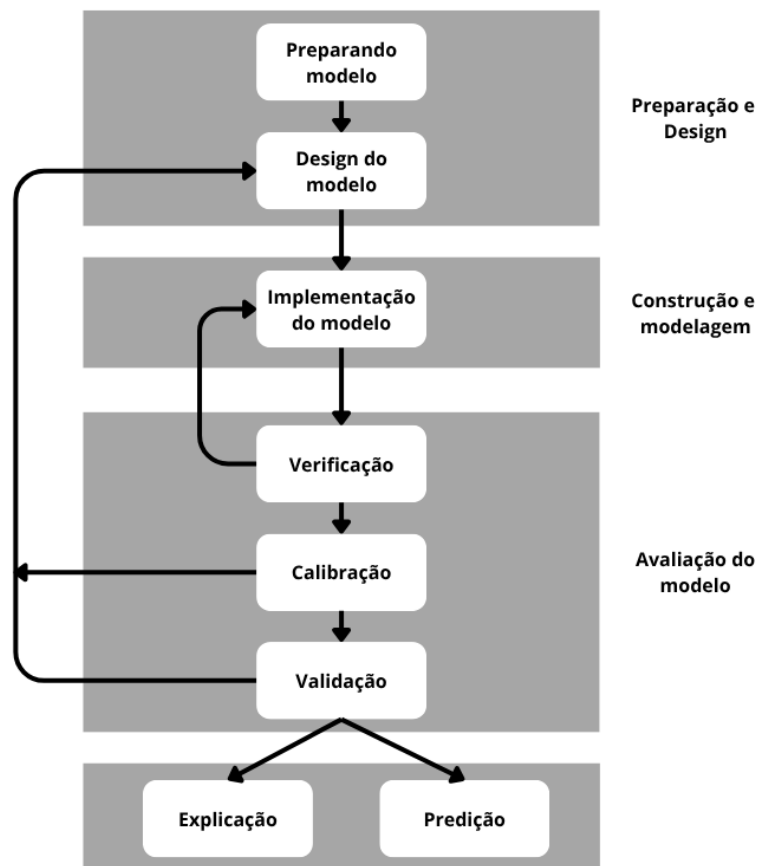

Fonte: Crooks et al. (2019) (Adaptado).

Conforme ilustrado na Figura 7, o ciclo de desenvolvimento da simulação é segmentado

em grandes fases. Inicialmente, ocorre a Preparação e Design, seguida pela sua Construção e Modelagem, onde o modelo computacional deve ser submetido a procedimentos de verificação, Calibração e Validação de seus parâmetros. Apenas após a consolidação dessas três etapas o Sistema Híbrido torna-se apto para as fases de Explicação e Predição, permitindo a explicação de fenômenos passados e a previsão de cenários futuros no canteiro de obras.

Com as diretrizes metodológicas do ciclo de desenvolvimento da simulação estabelecidas, o passo seguinte consiste na estruturação lógica. Segundo Crooks et al. (2019), a fundamentação desse protocolo abrange os seguintes aspectos centrais:

- **Visão Geral (Objetivo e Processo):** Define as metas principais e a justificativa metodológica para a utilização do modelo, estabelecendo de antemão os mecanismos macro do processo e os fatores decisórios que serão simulados.
- **Coleta de Dados:** Refere-se à obtenção e estruturação das informações essenciais para calibrar e validar o modelo computacional contra dados do mundo real.
- **Desenvolvimento e Software:** Trata da seleção das ferramentas computacionais e dos ambientes de programação adequados, considerando as exigências de arquitetura e processamento do Gêmeo Digital.
- **Visualização:** Permite a verificação contínua da coerência lógica do comportamento dos agentes pelo modelador e facilita a comunicação de resultados através de interfaces bidimensionais ou tridimensionais.
- **Vieses, Incertezas e Suposições:** Garante a transparência acadêmica ao declarar formalmente as premissas e simplificações adotadas para isolar os aspectos críticos de produtividade e qualidade, reduzindo a complexidade desnecessária do mundo real.
- **Contexto de Aplicação:** Delimita as fronteiras lógicas e físicas da simulação. Isso engloba o sistema exógeno limitante, a delimitação do **Espaço** geográfico/celular da obra, a escala de **Tempo**, o tamanho da **População** e as **Regras Físicas** que impedem sobreposições espaciais ilógicas.
- **Interações:** Estruturam a dinâmica sistêmica do canteiro. Incluem as interações **físicas**, ou seja, as forças de atração ou restrições de ocupação em um cômodo, as vias de **comunicação** de status da obra e a lógica de **troca de recursos** indiretos essenciais para a continuidade do fluxo.
- **Agentes:** Representam as entidades autônomas responsáveis por impulsionar a simulação híbrida. O projeto metodológico do agente encapsula três pilares: suas **Características** intrínsecas, suas **Decisões** e suas **Ações**.

Sendo assim, é possível organizar as premissas do sistema de forma padronizada. A Tabela 2 sintetiza o protocolo geral de modelagem e os parâmetros de entrada definidos para o presente projeto

**Tabela 2 – Dimensões de Modelagem, Adaptado de Araújo (2025)**


| Aspecto                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visão Geral: Objetivo e processo | O modelo explora as etapas macro da produção de paredes de concreto e os fatores envolvidos na decisão do agente de concluir as principais atividades do processo, que influenciam a ocorrência de não conformidades e problemas de produtividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coleta de Dados                  | Entrevistas, observação direta no local e revisão bibliográfica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Software de desenvolvimento      | AnyLogic 8.9.1, AnyLogic 8.9.7 e Nvidia Omniverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Visualização                     | Planta bidimensional no AnyLogic e posterior conexão do modelo no Omniverse NVIDIA para exibir a simulação em três dimensões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vieses, incertezas e suposições  | O modelo possui suposições e simplificações para reduzir a complexidade e representar apenas os principais aspectos do processo construtivo relacionados à qualidade e à produtividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contexto de aplicação            | <p><b>Sistema Externo:</b> O foco será no contexto dos sistemas construtivos da parede de concreto durante a produção da parede utilizando fôrmas metálicas.</p> <p><b>Espaço:</b> Espaço pequeno, limitado pelo pavimento do edifício, simulando uma obra da “Minha Casa Minha Vida”.</p> <p><b>Tempo:</b> Médias obtidas a partir de observações no local.</p> <p><b>População:</b> Equipe de montagem de fôrmas e trabalhadores associados.</p> <p><b>Regras Físicas:</b> Os agentes devem respeitar as restrições espaciais de uma célula e a presença de outros agentes durante a movimentação.</p> |
| Interações                       | <p><b>Interações Físicas:</b> Cada agente ocupa uma célula diferente, e deve haver no máximo dois agentes por sala.</p> <p><b>Comunicação:</b> Comunicação entre os agentes trabalhadores e o processo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Aspecto | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Troca de recursos:</b> Troca indireta de recursos entre a empresa e os agentes.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agentes | <b>Características:</b> Trabalhador de montagem e desmontagem.<br><b>Decisões:</b> O modelo cognitivo leva o agente a tomar a decisão de concluir as principais atividades do processo.<br><b>Ações:</b> Comportamento adequado/inadequado na conclusão das atividades necessárias que influencia as causas de conformidade/não conformidade. |

#### 4.1.1 Descrição do contexto da obra

A Figura 8 descreve, de modo geral, as etapas macro etapas do processo de produção de paredes de concreto em um edifício, utilizando fôrmas metálicas e trabalhadores como agentes passivos e ativos de interesse, respectivamente.

**Figura 8 – Etapas gerais do processo de produção de paredes de concreto em um edifício.**

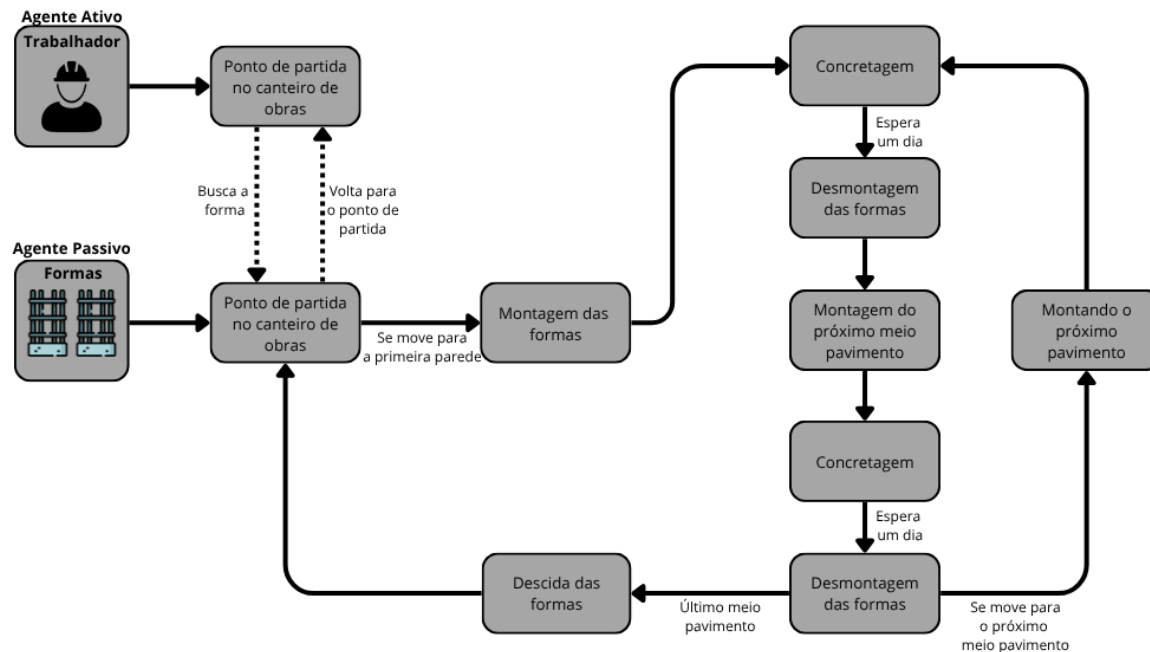

**Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).**

Conforme ilustrado na Figura 8, o fluxo construtivo é estruturado em um ciclo contínuo de macro etapas sequenciais. Nessa dinâmica, o operário atua como o agente ativo, responsável pela tomada de decisão e execução, enquanto a fôrma metálica representa o agente passivo, por ser alvo de toda decisão do processo. A lógica de execução do modelo baseia-se na divisão do pavimento em dois setores (dois meios pavimentos por andar), uma estratégia logística adotada para otimizar a alocação de recursos. Inicialmente, o trabalhador parte de seu ponto de origem para coletar as fôrmas e iniciar a etapa de montagem no primeiro meio pavimento, etapa que sucede a colocação da armadura (tela metálica da estrutura) e as instalações elétricas e hidrossanitárias. Após a concretagem desse setor, o modelo incorpora um tempo de espera de um dia, referente à cura do concreto. Concluído esse prazo, os operários realizam a desforma e a limpeza, transferindo as fôrmas sequencialmente para iniciar a montagem do segundo meio pavimento, repetindo esse ciclo até completar todos os pavimentos da obra.


Para garantir a qualidade dos serviços de montagem e desmontagem, a empresa parceira utiliza Formulários de Verificação de Serviço diários. Contudo, observações em campo revelaram que os operários frequentemente negligenciam etapas obrigatórias. Essas omis-

sões envolvem tanto os itens previstos nos formulários quanto recomendações cruciais de manuais técnicos, a exemplo da aplicação de desmoldante e da inserção de capas plásticas nas ancoragens.

A análise de dados históricos e documentos da empresa evidenciou uma forte correlação entre o comportamento da equipe (omissão de tarefas), o surgimento de defeitos nas paredes e a consequente necessidade de retrabalho, fatores que comprometem severamente a produtividade da obra. Nesse sentido, a não execução de qualquer atividade essencial do fluxo de trabalho resulta na consolidação de uma não conformidade.

É exatamente diante dessa dinâmica de falhas operacionais, muitas vezes silenciosas, que surge a necessidade da aplicação da teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED), cuja modelagem lógica será detalhada nos próximos tópicos. Os itens do Formulário de Verificação de Serviço e Produtividade referentes à montagem e desmontagem das fôrmas considerados mais relevantes para o escopo da pesquisa, juntamente com itens pertinentes adicionais observados durante os estudos em campo (como a aplicação do agente desmoldante e a inserção ou remoção das proteções plásticas das faquetas), foram convertidos em atividades como referência para um fluxo de trabalho eficaz, seguindo o fluxo ilustrado na Figura 9.

**Figura 9 – Atividades necessárias para um fluxo de trabalho adequado durante a montagem e desmontagem.**

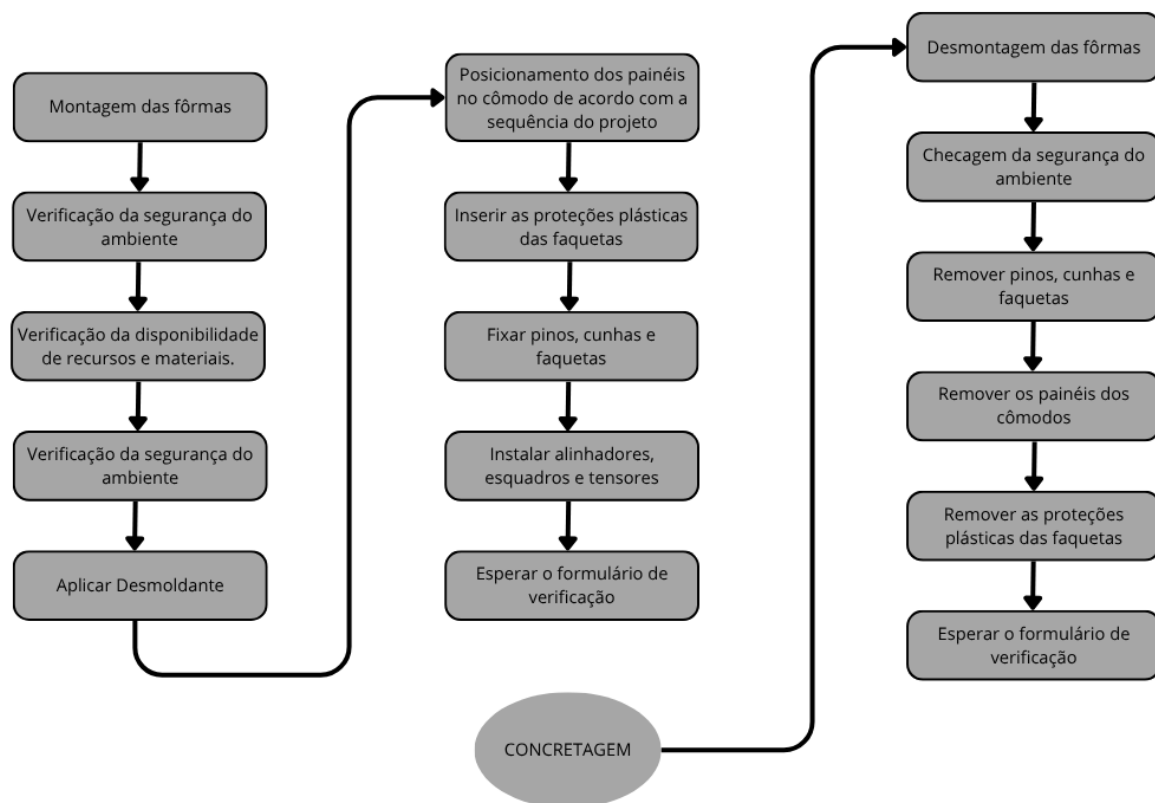

Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Segundo o fluxo delineado na Figura 9, o processo é estruturado em dois grandes ciclos operacionais, intermediados pela etapa de concretagem. A fase de montagem de fôrmas tem início com as verificações preliminares de segurança do ambiente e da disponibilidade de recursos e materiais. Adiante, executa-se a aplicação do agente desmoldante, seguida pelo posicionamento dos painéis conforme a sequência do projeto. A consolidação da estrutura exige a inserção das proteções plásticas das faquetas, o travamento mecânico (utilizando pinos, cunhas e as próprias faquetas) e, por fim, a instalação de alinhadores, esquadros e tensores. A liberação para a concretagem fica condicionada à espera e aprovação do formulário de verificação.


Após a concretagem e o período de cura (processo de manutenção da umidade e das condições adequadas para que o concreto desenvolva suas propriedades mecânicas, como resistência e durabilidade), inicia-se a fase de desmontagem. Esta etapa demanda uma nova checagem de segurança, procedendo-se com a remoção sequencial dos pinos, cunhas e faquetas, bem como a retirada de suas respectivas proteções plásticas. O ciclo é encerrado com uma nova submissão ao formulário de verificação, garantindo que os componentes estejam prontos e em conformidade para o transporte e reinício do processo no próximo

meio pavimento.

### 4.1.2 Etapas de Modelagem do Comportamento dos Trabalhadores

Após o mapeamento do processo de construção e considerando os aspectos intrínsecos relacionados aos projetos de construção, foi possível propor um modelo computacional híbrido para simular e analisar o comportamento dos trabalhadores com base nas macroetapas e nas atividades necessárias para a montagem e desmontagem de fôrmas. A arquitetura metodológica do modelo computacional híbrido, dividida em duas perspectivas complementares (Figuras 10 e 11), permite simular e analisar o comportamento dos operários em função das macroetapas de montagem e desmontagem das fôrmas. A DES rege o fluxo físico e logístico da construção da parede de concreto, enquanto que a ABM executa a análise cognitiva das decisões dos trabalhadores durante a execução das tarefas.

Figura 10 – Estrutura da simulação utilizando DES.

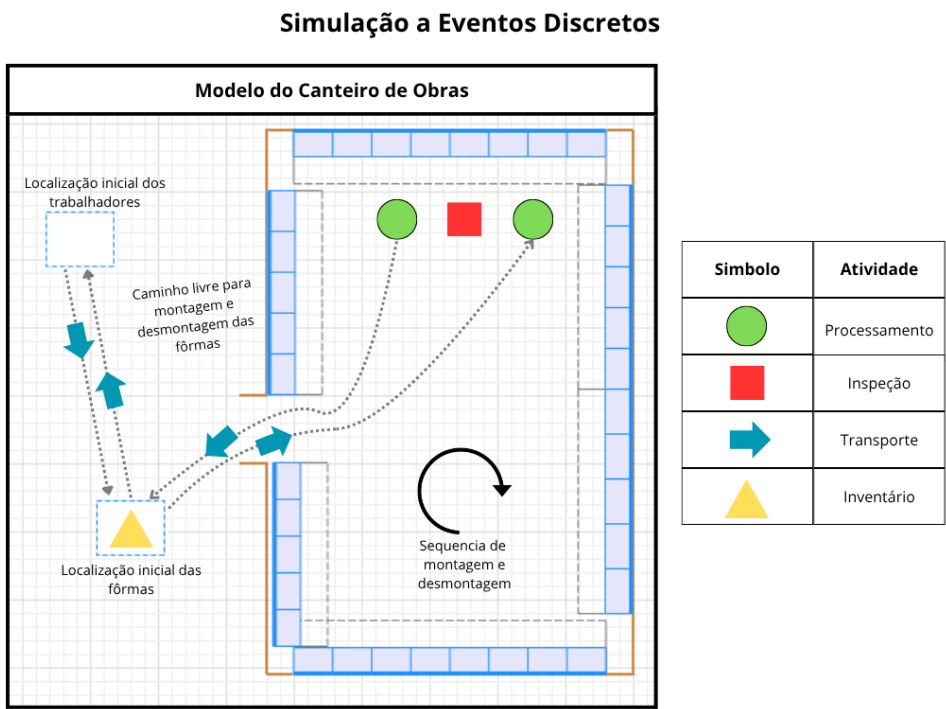

Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Figura 11 – Estrutura da simulação utilizando ABM.



Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).


A Figura 10 detalha o Modelo do Canteiro de Obras sob a ótica da DES. O ambiente espacial simula a geometria de um cômodo pertencente a um apartamento típico do sistema construtivo em estudo. Alinhada à realidade da Empresa A e do setor, a meta de produção estabelecida no modelo é a execução de um meio pavimento por dia. A dinâmica do sistema obedece a um fluxo logístico rigoroso, categorizando as ações em inventário (localização inicial das fôrmas e operários), transporte (trajetórias de movimentação), processamento (montagem e desmontagem) e inspeção.

Por sua vez, a Figura 11 ilustra a lógica interna da ABM. O diagrama sequencia os principais Eventos (E) e Tempos de Espera (T) vinculados às macroetapas da obra. Como regra de negócio do modelo, as operações de montagem e desmontagem possuem pré-requisitos estritos, como por exemplo, elas só são iniciadas mediante a verificação de segurança do ambiente e a disponibilidade de recursos físicos (agente desmoldante, faquetas, cunhas, pinos e alinhadores). Uma vez que as macroetapas de montagem (Evento 3) e desmontagem (Evento 5) são deflagradas, o modelo aciona as atividades operacionais (A1 a A10). É nesse nível de detalhe que a simulação híbrida se destaca: a execução correta ou a omissão de cada uma dessas subatividades dependerá exclusivamente do processo simulado de tomada de decisão do operário (agente ativo), permitindo quantificar o impacto dessas escolhas na qualidade e produtividade final do fluxo.

Para compreender como a tomada de decisão ocorre dentro da ABM, a Figura 12 detalha o esquema lógico utilizado para determinar a probabilidade ( $P$ ) de um operário

executar, ou não, cada atividade operacional. Este esquema consiste em uma adaptação do modelo de análise cognitiva proposto por Zhang et al. (2019), originalmente voltado para o comportamento de segurança de trabalhadores da construção civil, agora transposto para a análise de produtividade e conformidade de execução.

**Figura 12 – Análise do modelo cognitivo.**

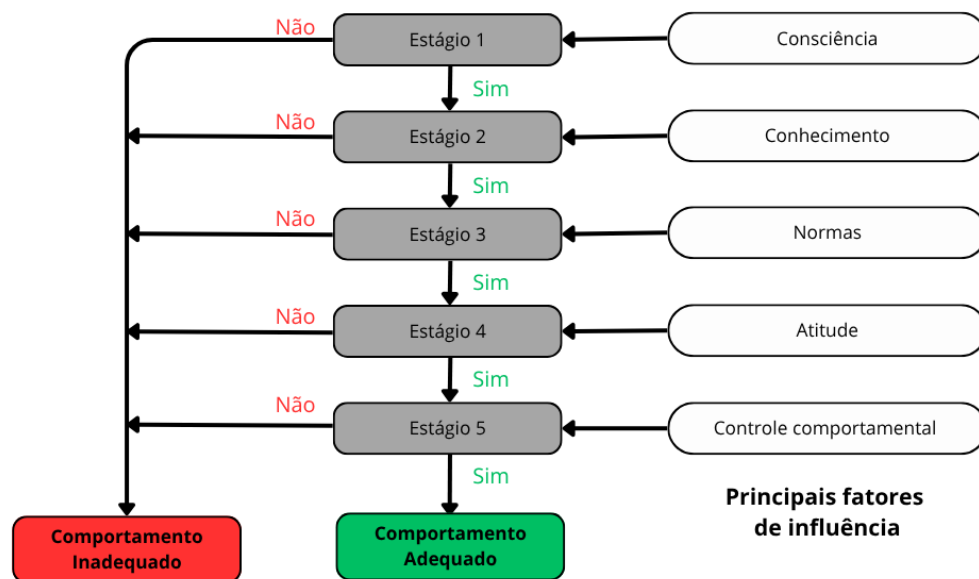

Fonte: (TAO; ZHANG; NEE, 2019) (Adaptado).

Conforme ilustrado no fluxograma, o processo cognitivo do agente é estruturado em uma sequência condicional de cinco estágios. A consolidação do Comportamento Adequado exige uma resposta afirmativa em todos os níveis. Caso contrário, qualquer interrupção na cadeia resulta inevitavelmente em um Comportamento Inadequado (falha ou omissão da tarefa). Os fatores de influência em cada estágio são definidos da seguinte forma:

1. **Consciência (Estágio 1):** Refere-se à percepção inicial do trabalhador sobre a existência e a necessidade da atividade de produção exigida naquele momento.
2. **Conhecimento (Estágio 2):** Envolve a compreensão do agente acerca das possíveis consequências geradas pela omissão da tarefa (como defeitos na parede e necessidade de retrabalho).

3. **Normas (Estágio 3):** Representa o resgate, na memória de longo prazo do trabalhador, das diretrizes técnicas e normas da empresa ao perceber um potencial problema de produção.
4. **Atitude (Estágio 4):** Trata-se da decisão ativa e intencional do operário de adotar a conduta correta para concluir a atividade de produção.
5. **Controle Comportamental (Estágio 5):** Refere-se à capacidade real (técnica e física) percebida pelo trabalhador para responder à demanda e executar o comportamento decidido.

Dessa forma, o modelo computacional utiliza essa arquitetura de cinco filtros probabilísticos para simular, de forma realista, as nuances humanas que levam ao desvio de padrão no canteiro de obras. As respostas probabilísticas determinam a tendência do agente em adotar um comportamento adequado ou inadequado ao longo da simulação. Nesse processo iterativo, curvas de aprendizado são empregadas para determinar os resultados parciais em cada um dos estágios cognitivos. A expressão geral utilizada para calcular a probabilidade do comportamento é apresentada na Equação 7:

$$P = (1 - X_1) + \sum_{j=2}^5 \left[ (1 - X_j) \prod_{i=1}^{j-1} X_i \right] \quad (7)$$

Nessa formulação, adaptada de Tao, Zhang e Nee (2019), cada um dos cinco estágios do modelo cognitivo possui um fator de influência chave específico. As variáveis e operadores da equação são definidos da seguinte forma:

- $P$ : representa a probabilidade final de o agente adotar um comportamento inadequado (consolidando a falha).
- $X_1$ : representa o valor do fator de influência chave no primeiro estágio (Consciência).
- O operador de somatório ( $\sum$ ) percorre os estágios subsequentes do modelo cognitivo (do estágio 2 ao 5).
- O operador de produtório ( $\prod$ ) itera sobre todos os estágios anteriores ao estágio  $j$ , calculando a contribuição do sucesso acumulado na probabilidade final de falha.
- $X_j$  e  $X_i$ : representam os valores dos fatores de influência chave nos estágios  $j$  e  $i$ , respectivamente.

Para incorporar o ganho de experiência do trabalhador em função do tempo e da repetição das tarefas, o modelo utiliza uma equação geral de curva de aprendizado aplicada a cada um dos cinco estágios, expressa na Equação 8:

$$Y(t) = 1 - (1 - Y(0))X(t)^{-\theta} \quad (8)$$

Onde a constante que dita o ritmo dessa evolução técnica é a Taxa de Aprendizado (*Learning Rate*), definida pela Equação 9:

$$\text{Taxa de Aprendizado} = 2^{-\theta} \quad (9)$$

#### 4.1.3 Coleta de dados para definição dos fatores de influência, parâmetros e variáveis

Esta seção detalha o processo de coleta de dados empíricos para viabilizar as operações práticas da simulação e permitir a criação e análise de diferentes cenários. Segundo Araújo (2025), objetivo principal das idas a campo foi monitorar o fluxo de trabalho na produção das paredes de concreto, identificar os problemas mais recorrentes nas fases de montagem e desmontagem das fôrmas metálicas, avaliar o grau de dificuldade das atividades obrigatórias e determinar os principais fatores que influenciam a não conformidade dessas tarefas, segundo a percepção dos próprios trabalhadores.

Os dados coletados não apenas validaram o problema prático com base na experiência operacional da equipe, mas também forneceram os parâmetros de entrada para o modelo computacional. Cabe destacar que, embora o estudo utilize um caso exemplar específico, os valores padrão dos parâmetros e variáveis podem ser facilmente ajustados para simular outros canteiros de obras que adotem o mesmo sistema construtivo.

Adaptado ao modelo de Tao, Zhang e Nee (2019), originalmente voltada à segurança do trabalho, o diferencial desta pesquisa reside na introdução de uma simulação híbrida, que incorpora elementos de DES e um modelo de detecção de falhas utilizando SED.

A parametrização do tempo demandou a observação direta e a cronometragem do período despendido pelos operários na execução de cada atividade obrigatória (A1 a A10) (ARAÚJO, 2025). É importante ressaltar que essas estimativas refletem o desempenho de uma equipe específica no canteiro de obras analisado, aproximando os parâmetros daquela realidade particular, sem a pretensão de generalizar para todos os cenários possíveis da construção civil. Contudo, a flexibilidade do software permite que o usuário modifique esses valores para estudos futuros.

Durante a coleta, observou-se que algumas atividades apresentavam tempos de execução consistentes, sendo consolidadas no modelo como tempos médios fixos. Por outro lado, tarefas com maior variabilidade natural foram modeladas como intervalos de tempo (valores mínimo e máximo), permitindo que a simulação aplique uma função de distribuição para selecionar o tempo de forma estocástica a cada ciclo. Os tempos médios e os intervalos derivados dessa análise, medidos em segundos, estão consolidados na Figura 13.

Figura 13 – Tempo médio observado de cada etapa


| Tempo de execução (s)   | Principais atividades dos agentes                    |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 30 (por fôrma) ↔        | A1: Checagem das condições das fôrmas                | P1  |
| 12 ~ 60 (por fôrma) ↔   | A2: Aplicação de desmoldante                         | P2  |
| 9 ~ 14 (por fôrma) ↔    | A3: Posicionamento dos painéis na sala               | P3  |
| 60 (por fôrma) ↔        | A4: Inserção do plástico de proteção das faquetas    | P4  |
| 150 ~ 240 (por fôrma) ↔ | A5: Fixação dos pinos, cunhas e faquetas             | P5  |
| 50 ~ 240 (por parede) ↔ | A6: Instalação dos alinhadores, esquadros e tensores | P6  |
| 20 (por parede) ↔       | A7: Remoção dos alinhadores, esquadros e faquetas    | P7  |
| 52 (por fôrma) ↔        | A8: Remoção dos pinos, cunhas e faquetas             | P8  |
| 9 ~ 14 (por fôrma) ↔    | A9: Remoção dos painéis                              | P9  |
| 60 (por fôrma) ↔        | A10: Remoção do plástico de proteção das faquetas    | P10 |

Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Para aprofundar a análise, o estudo também investigou os fatores de influência subjacentes às falhas de processo. Por meio de um questionário aplicado a 15 trabalhadores, buscou-se identificar quais elementos mais induzem a omissão de atividades obrigatórias durante a montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). As opções de múltipla escolha fornecidas aos respondentes foram fundamentadas na literatura, principalmente nos estudos de Tao, Zhang e Nee (2019), havendo também um campo aberto para sugestões.

A análise dos resultados, ilustrada na Figura 14, ranqueou a percepção dos operários sobre esses fatores. O defeito mais frequentemente apontado foi a “Falta de materiais ou recursos, como ferramentas e equipamentos”. Em segundo lugar, empataram a “Falta de comunicação por parte de gerentes e supervisores” e a “Falta de experiência ou conhecimento dos trabalhadores”. Na sequência, foram citados o “Estresse do trabalhador” e a “Pressão para acelerar o trabalho”. Fatores como “Prazos apertados”, “Falta de inspeções” e “Falta de treinamento” apresentaram menor incidência. No campo aberto, a própria rotina intensa do canteiro de obras foi relatada como um fator influente.

Figura 14 – Questionário sobre fatores para omissões dos trabalhadores

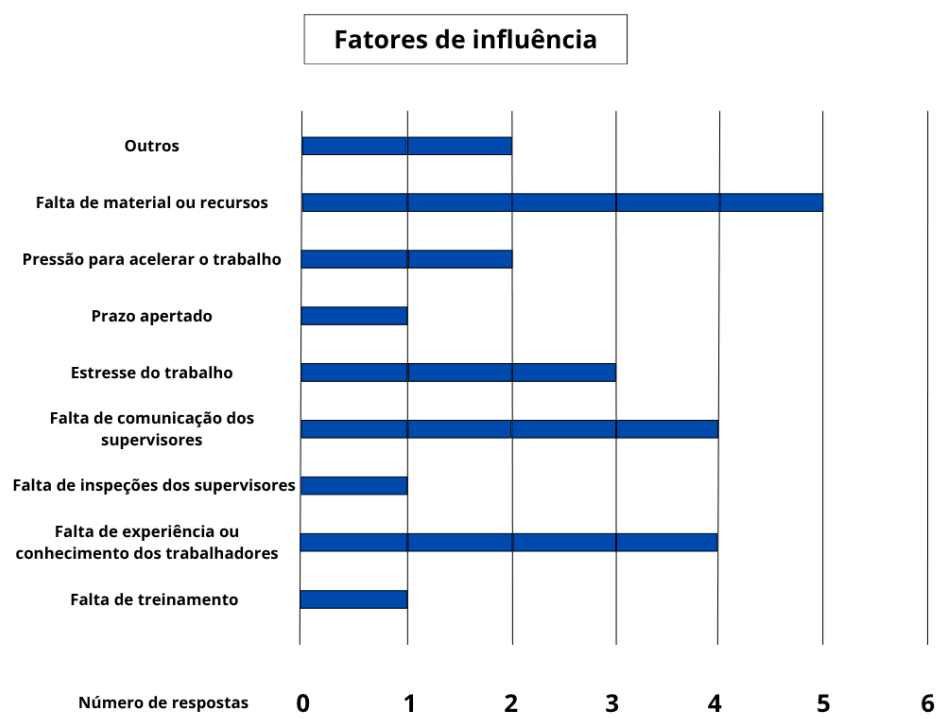

Fonte: (ARAÚJO, 2025) (Adaptado).

Após o processamento desses dados, o fator “Falta de materiais ou recursos” foi desvinculado do modelo cognitivo e estabelecido como um pré-requisito físico na Simulação a Eventos Discretos (DES), uma vez que o fluxo de trabalho não pode avançar sem esses itens essenciais.

Como não surgiram ideias comportamentais adicionais fora do que já estava previsto na literatura, os demais fatores apontados pelos trabalhadores foram analisados metodologicamente e agrupados. Esse esforço de síntese resultou em cinco parâmetros de influência chave, detalhados na Tabela 3. Cada parâmetro consolida um grupo de percepções do canteiro e foi diretamente vinculado a um estágio específico do processo de tomada de decisão do modelo cognitivo.

Tabela 3 – Estágios do modelo cognitivo e parâmetros de influência adotados no estudo, Adaptado de Araújo (2025)

| Variável ( $X_i$ ) | Estágio Cognitivo       | Parâmetro de Influência |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| $X_1$              | Consciência             | Treinamento             |
| $X_2$              | Conhecimento            | Experiência             |
| $X_3$              | Normas                  | Inspeção                |
| $X_4$              | Atitude                 | Feedback                |
| $X_5$              | Controle Comportamental | Nível de Estresse       |

Cabe destacar que a arquitetura da simulação mantém sua flexibilidade, podendo ser facilmente adaptada para testar outras formulações cognitivas. Além disso, como os parâmetros de influência calibram as curvas de aprendizado em cada estágio, o modelo

captura a evolução empírica da equipe: quanto maior o número de ciclos de produção concluídos, maior o aprendizado acumulado e, conseqüentemente, menor a probabilidade de os operários omitirem as atividades obrigatórias.

Em síntese, o levantamento em campo confirmou que os operários percebem diversos problemas recorrentes atrelados à montagem e desmontagem das fôrmas, os quais têm origens tanto estruturais quanto cognitivas. A modelagem computacional foi instanciada no software *AnyLogic*, incorporando a lista definitiva de atividades obrigatórias e seus respectivos tempos de execução. Os pesos atribuídos a essas tarefas na simulação refletem diretamente o grau de dificuldade relatado pelos trabalhadores para concluí-las.

Por fim, informações como a duração global dos serviços e as diretrizes de layout do canteiro de obras foram obtidas por meio de entrevistas não estruturadas com a equipe de gestão e fundamentadas na experiência empírica do pesquisador com este sistema construtivo específico.

## 4.2 SED

Esta seção detalha as etapas de desenvolvimento do diagnosticador do SED. Como evidenciado na modelagem comportamental prévia, o processo produtivo de montagem e desmontagem de fôrmas é suscetível a falhas não observáveis decorrentes das omissões dos trabalhadores. Para diagnosticar matematicamente essas anomalias, é possível adotar a teoria do SED, baseado no modelo de Basilio et al. (2010). Sob essa ótica, o fluxo logístico da construção será modelado por meio de autômatos de estados finitos determinísticos.

Formalmente, o sistema construtivo é representado por um gerador de linguagem, definido pela quintupla:


$$G = (X, \Sigma, f, x_0, X_m)$$

Onde cada parâmetro descreve uma característica física ou lógica do processo de execução das paredes de concreto, conforme detalhado nas subseções a seguir. O desenvolvimento estruturado desse autômato ( $G$ ) formará a base teórica necessária para a posterior síntese do autômato diagnosticador.

### 4.2.1 Espaço de Estados ( $X$ ) e Estado Inicial ( $x_0$ )

O conjunto finito de estados  $X$  representa as condições operacionais do canteiro de obras em um dado instante de tempo. Na modelagem da execução das fôrmas, um estado consolida a situação atual do fluxo físico. Com base nas principais atividades realizadas pelo trabalhador, definidas na figura 11, é possível definir os estados do SED.

Figura 15 – Estados do SED

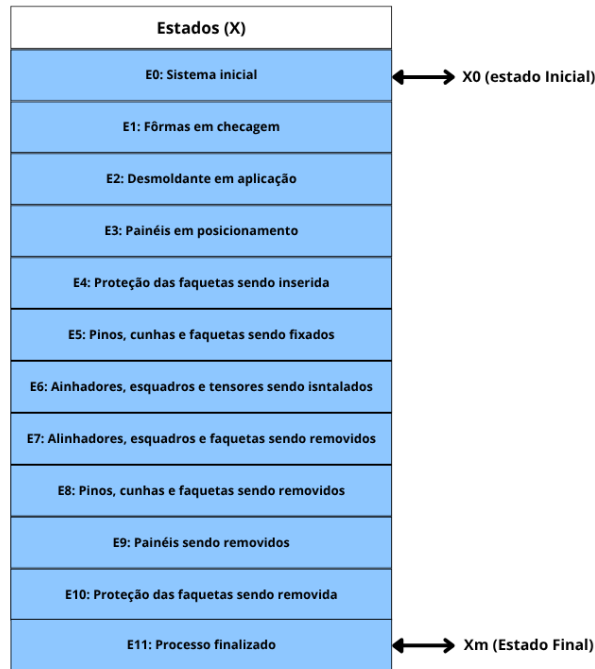

Fonte: Autoral.

Dentro desse espaço, define-se o estado inicial  $x_0 \in X$ . Ele representa o ponto de partida do ciclo construtivo de um meio pavimento, caracterizado pela verificação de segurança e pela disponibilidade inicial de recursos e ferramentas antes da execução da primeira atividade, marcado como  $E_0$  na figura 15. O estado final, ou subconjunto de estados marcados, é representado por  $X_m \subseteq X$ . Na modelagem proposta, o estado  $E_{11}$  atua como o estado marcado, designando a conclusão de todas as etapas de montagem e desmontagem das fôrmas. Atingir este estado indica que o ciclo produtivo daquele meio pavimento foi finalizado e o sistema está apto a reiniciar o fluxo na próxima fôrma.

#### 4.2.2 Conjunto de Eventos ( $\Sigma$ ) e Conjunto de Eventos de Falhas ( $\Sigma_f$ )

O conjunto finito de eventos  $\Sigma$  engloba todas as ocorrências capazes de alterar o estado do sistema. No contexto desta pesquisa, os eventos correspondem à conclusão das macroetapas e das atividades obrigatórias detalhadas no capítulo anterior (como a aplicação de desmoldante, travamento mecânico, etc.).

Para viabilizar a arquitetura de diagnóstico, esse conjunto é particionado de forma disjunta em duas categorias principais:

$$\Sigma = \Sigma_o \cup \Sigma_{uo}$$

Onde  $\Sigma_o$  representa o conjunto de Eventos Observáveis e  $\Sigma_{uo}$  representa os Eventos Não Observáveis. Dentro de  $\Sigma_{uo}$ , encontra-se o subconjunto de Eventos de Falhas ( $\Sigma_f$ ), que

modela matematicamente o momento exato em que o operário decide omitir uma atividade obrigatória de forma velada.

A fim de definir o Conjunto de Eventos, utilizou-se como base o sequenciamento lógico das etapas de montagem e desmontagem, que ditam as transições entre os estados previamente mapeados na Figura 15. Dessa forma, os eventos regulares que compõem o sistema representam as ações operacionais (como “Processo Iniciado” ou “Desmoldante Aplicado”) que impulsionam o fluxo do canteiro de obras do estado inicial ( $E_0$ ) até a sua conclusão no estado marcado ( $E_{11}$ ).

Para fins de notação e padronização do modelo matemático, os eventos observáveis foram indexados com a letra “O” (do inglês *Observable*), enquanto os eventos não observáveis foram indexados com a letra “U” (do inglês *Unobservable*). Conforme detalhado na Figura 33, o único evento regular da operação classificado como não observável ( $U_1$ ) corresponde à conclusão da checagem das fôrmas. Essa modelagem justifica-se pelo fato de que, na dinâmica real do canteiro de obras, não há um mecanismo de controle formal que permita validar de maneira inequívoca se o trabalhador de fato realizou, ou não, essa inspeção visual preliminar.

**Figura 16 – Eventos Observáveis ( $\Sigma_o$ ) e Eventos Não Observáveis ( $\Sigma_{uo}$ ).**

| Eventos Observáveis ( $\Sigma_o$ )               | Eventos Não Observáveis ( $\Sigma_{uo}$ )                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| O1: Processo Iniciado                            | U1: Checagem das fôrmas concluída                           |
| O2: Desmoldante aplicado                         | Eventos de Falha ( $\Sigma_f$ )                             |
| O3: Painéis Posicionados                         | F1: Omissão da verificação das condições iniciais           |
| O4: Plástico de proteção das faquetas inserido   | F2: Checagem mal executada                                  |
| O5: Pinos, cunhas e faquetas fixados             | F3: Omissão na aplicação do desmoldante                     |
| O6: Alinhadores, esquadros e tensores instalados | F4: Falha ou omissão na fixação de pinos, cunhas e faquetas |
| O7: Alinhadores, esquadros e faquetas removidos  | F5: Falha na remoção dos plásticos de proteção das faquetas |
| O8: Pinos, cunhas e faquetas removidos           |                                                             |
| O9: Painéis removidos                            |                                                             |
| O10: Plástico de proteção das faquetas removido  |                                                             |
| O11: Processo Finalizado                         |                                                             |

**Fonte: Autoral.**

A definição do Conjunto de Eventos de Falha foi feita a partir dos dados obtidos por meio de um questionário aplicado aos trabalhadores, desenvolvido e documentado por Araújo (2025), com as observações diretas realizadas no canteiro de obras. O questionário avaliou a percepção dos operários quanto aos problemas mais frequentes e o grau de

dificuldade das tarefas de montagem e desmontagem.

A premissa adotada no modelo lógico é que atividades classificadas com alto grau de dificuldade impõem maior carga cognitiva e física aos agentes, aumentando a probabilidade de omissão na prática. As Tabelas 4 e 5 apresentam o ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis nessas duas fases da execução, conforme o levantamento de Araújo (2025).

**Tabela 4 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a montagem.**

| Posição        | Atividade                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>a</sup> | Verificar as condições de segurança do ambiente antes de iniciar a montagem. |
| 2 <sup>a</sup> | Verificar a limpeza das fôrmas, escoras e acessórios antes de iniciar.       |
| 3 <sup>a</sup> | Verificar a integridade das fôrmas e relatar defeitos ao supervisor.         |
| 4 <sup>a</sup> | Fixar as fôrmas com todas as faquetas, pinos e cunhas necessários.           |
| 5 <sup>a</sup> | Instalar todos os alinhadores, esquadros e tensores necessários no ambiente. |
| 6 <sup>a</sup> | Posicionar as fôrmas no ambiente conforme a sequência do projeto.            |
| 7 <sup>a</sup> | Aplicar desmoldante no verso das fôrmas antes de fixar cada painel.          |
| 8 <sup>a</sup> | Inserir os plásticos de proteção em todas as faquetas.                       |

Fonte: Araújo (2025) (Adaptado).

**Tabela 5 – Ranqueamento das atividades obrigatórias consideradas mais difíceis durante a desmontagem.**

| Posição        | Atividade                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>a</sup> | Transportar cuidadosamente as fôrmas para o próximo meio pavimento.                  |
| 2 <sup>a</sup> | Remover cuidadosamente os painéis durante a desmontagem.                             |
| 3 <sup>a</sup> | Remover os plásticos de proteção das faquetas.                                       |
| 4 <sup>a</sup> | Remover todas as faquetas, pinos e cunhas antes de mover os painéis.                 |
| 5 <sup>a</sup> | Remover todos os alinhadores, esquadros e tensores do ambiente antes da desmontagem. |

Fonte: Araújo (2025) (Adaptado).

Da mesma forma, atividades cujas omissões não são percebidas pelos trabalhadores como defeitos, mas que foram constatadas *in loco* pela pesquisa de Araújo (2025), representam anomalias furtivas ideais para o rastreamento via autômato diagnosticador. Desta forma, os eventos de falha mais críticos selecionados para a implementação matemática no SED foram:

- **F1 - Omissão da verificação das condições iniciais (Segurança, limpeza e integridade):** Configura a burla das atividades ranqueadas em 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> lugares como as mais difíceis durante a fase de montagem (Tabela 4). Está diretamente associada ao estado não observável  $E_1$ .
- **F2 - Checagem das fôrmas mal executada:** Ainda em relação às 3 atividades ranqueadas como mais difíceis durante a montagem, destaca-se as atividades de verificação e checagem de integridade das fôrmas, portanto esta falha foi escolhida

- **F3 - Omissão na aplicação do desmoldante:** Considerada uma falha crítica de rastreamento porque, embora a omissão tenha sido frequentemente observada *in loco*, os dados revelaram que os trabalhadores não a percebem como um problema, configurando um ponto cego operacional (ARAÚJO, 2025).
- **F4 - Falha ou omissão na fixação de pinos, cunhas e faquetas:** Selecionada por ter sido apontada no questionário como um dos problemas mais frequentes no canteiro e por ocupar a 4<sup>a</sup> posição no ranking de dificuldade de montagem.
- **F5 - Falha na remoção dos plásticos de proteção das faquetas:** A remoção desses componentes ocupou o 3<sup>o</sup> lugar no ranking de dificuldade durante a desmontagem (Tabela 5).

Esses eventos não observáveis em  $\Sigma_f$  representam desvios críticos da rota ideal do autômato. No modelo do SED, a ocorrência de qualquer um desses eventos leva o sistema de um estado regular para um estado de falha, acionando a necessidade de o diagnosticador utilizar a sequência de eventos observáveis subsequentes ( $\Sigma_o$ ) para inferir, retrospectivamente, qual omissão foi cometida pela equipe.

### 4.2.3 Função de Transição Parcial ( $f$ )

A evolução sequencial do canteiro de obras é formalizada pela função de transição parcial, definida como:

$$f : X \times \Sigma \rightarrow X$$

A função  $f(x, \sigma)$  estabelece o novo estado do sistema após a ocorrência de um evento  $\sigma \in \Sigma$ , partindo de um estado atual  $x \in X$ . No contexto da execução das paredes de concreto, essa função atua como o controle lógico de precedência do projeto.

Para a construção de  $f$ , o fluxo foi estruturado assumindo que o avanço físico da montagem e desmontagem das fôrmas ocorre de forma sequencial (do estado  $E_0$  ao  $E_{11}$ ). Esse avanço pode ser impulsionado tanto pelos eventos regulares (observáveis  $O_i$  e não observável  $U_1$ ) quanto pelos eventos de falha ( $f_i$ ). A Tabela 6 detalha exhaustivamente todas as transições mapeadas no autômato gerador ( $G$ ).

Tabela 6 – Mapeamento da Função de Transição Parcial ( $f$ ) do sistema de fôrmas.

| Estado Atual           | Evento   | Descrição                        | Próximo Estado |
|------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| <b>Fluxo Regular</b>   |          |                                  |                |
| $E_0$                  | $O_1$    | Observável                       | $E_1$          |
| $E_1$                  | $U_1$    | Não Observável                   | $E_2$          |
| $E_2$                  | $O_3$    | Observável                       | $E_3$          |
| $E_3$                  | $O_4$    | Observável                       | $E_4$          |
| $E_4$                  | $O_5$    | Observável                       | $E_5$          |
| $E_5$                  | $O_6$    | Observável                       | $E_6$          |
| $E_6$                  | $O_7$    | Observável                       | $E_7$          |
| $E_7$                  | $O_8$    | Observável                       | $E_8$          |
| $E_8$                  | $O_9$    | Observável                       | $E_9$          |
| $E_9$                  | $O_{10}$ | Observável                       | $E_{10}$       |
| $E_{10}$               | $O_{11}$ | Observável                       | $E_{11}$       |
| <b>Fluxo de Falhas</b> |          |                                  |                |
| $E_0$                  | $F_1$    | Omissão da verificação inicial   | $E_1$          |
| $E_1$                  | $F_2$    | Checagem mal executada           | $E_2$          |
| $E_2$                  | $F_3$    | Omissão do desmoldante           | $E_3$          |
| $E_5$                  | $F_4$    | Falha na fixação de pinos        | $E_6$          |
| $E_8$                  | $F_5$    | Omissão da remoção dos plásticos | $E_9$          |

Fonte: Autoral.

Observe que as falhas modeladas levam o sistema para o mesmo estado físico subsequente que o evento regular correspondente levaria (por exemplo, tanto  $O_1$  quanto  $F_1$  levam o canteiro ao estado  $E_1$ ). Essa é a representação matemática do fato de que o trabalhador continua o processo construtivo mesmo tendo pulado ou executado mal uma etapa. Para a gestão da obra, a parede parece estar sendo montada normalmente, reforçando a natureza oculta da anomalia.

#### 4.2.4 Arquitetura do Autômato Diagnosticador ( $G_d$ )

Uma vez definidas as regras lógicas e a quintupla que compõe o gerador da planta ( $G$ ), a metodologia requer a síntese de um sistema supervisor capaz de inferir a ocorrência dos eventos ocultos de falha com base exclusivamente no fluxo de eventos observáveis que a gestão da obra consegue enxergar.

Para isso, adota-se a construção do autômato diagnosticador, formalmente denotado como  $G_d$ . A síntese do  $G_d$  consiste em calcular o fechamento não observável do sistema e atribuir *labels* (rótulos) aos estados estimados. Segundo a formulação clássica de Basilio et al. (2010), cada estado do diagnosticador carrega consigo o diagnóstico atual da planta, podendo ser classificado como:

- **Normal ( $N$ ):** Quando se tem certeza de que nenhuma falha ocorreu.
- **Falha ( $F_i$ ):** Quando se tem certeza de que a falha do tipo  $i$  ocorreu.

- **Incerto ( $N, F_i$  ou  $F_i, F_j$ ):** Quando os eventos observáveis até o momento não são suficientes para distinguir se o sistema está em um estado normal ou se já sofreu uma falha.

O desenvolvimento do autômato da planta e a posterior geração e análise do diagnosticador para a execução das paredes de concreto serão apresentados no capítulo de Resultados.

### 4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO


Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da implementação dos modelos propostos. A análise é dividida em duas grandes etapas: primeiramente, avalia-se o comportamento do sistema produtivo por meio da simulação computacional híbrida e sua respectiva visualização avançada, em seguida, apresenta-se a síntese do SED capaz de rastrear as falhas comportamentais observadas na simulação.

#### 4.3.1 Simulação Híbrida no AnyLogic

A simulação híbrida, combinando a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e a Simulação a Eventos Discretos (DES), foi implementada no software AnyLogic. O protótipo computacional foi alimentado com os parâmetros e variáveis coletados empiricamente no canteiro de obras, incorporando os tempos de execução, as curvas de aprendizado, as percepções de dificuldade dos trabalhadores para cada atividade obrigatória da montagem e desmontagem das fôrmas e a disposição física da obra.

Primeiramente, foram estruturados os agentes da simulação: as fôrmas (*Formworks*) e os trabalhadores (*Workers*). No ambiente de modelagem AnyLogic, os agentes representam entidades com participação ativa ou passiva no sistema. Nesse sentido, as fôrmas atuam como os principais elementos de fluxo da DES, enquanto os trabalhadores representam os agentes autônomos da ABM.


Figura 17 – Propriedades do Agente fôrma.

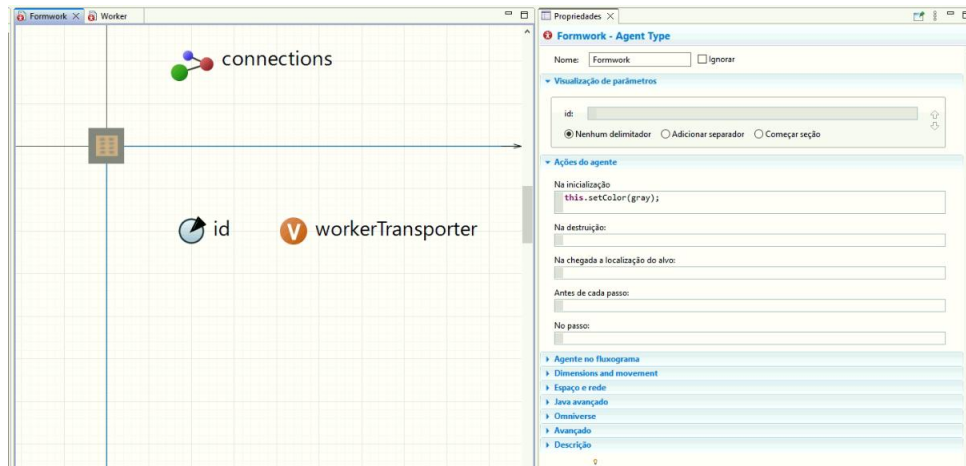

Fonte: Autoral.

Conforme ilustrado na Figura 17, cada fôrma possui um parâmetro de identificação exclusivo (*id*) e armazena a informação do trabalhador associado responsável pelo seu transporte. No ambiente principal da simulação (*Main*), o modelo foi projetado com arquitetura escalável para permitir a análise de múltiplas frentes de trabalho operando simultaneamente. Para isso, o Agente Fôrma foi instanciado em quatro populações distintas (Figura 18). Cada população agrupa uma dupla de fôrmas direcionada a um setor específico da obra. Devido à sua natureza estática até serem manipuladas, a velocidade inicial desses agentes foi definida como zero, juntamente com a atribuição de sua localização espacial de origem.

Figura 18 – Propriedades da população de fôrmas.

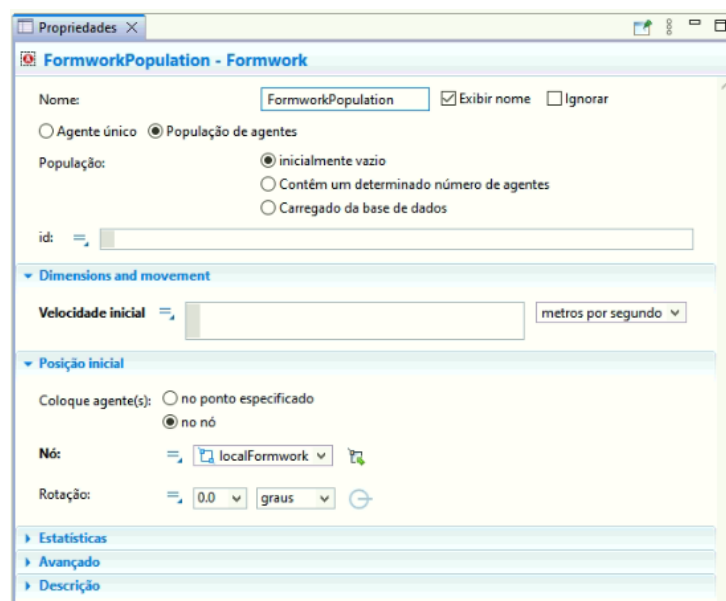

Fonte: Autoral.

De maneira análoga, foram criados os agentes dos trabalhadores e inseridos na *Main*

do projeto. Para espelhar a distribuição das fôrmas e manter a escalabilidade do canteiro, o Agente Trabalhador foi distribuído em quatro populações (Figuras 19 e 20). Cada uma dessas populações é composta por uma dupla de operários, nascendo inicialmente vazias e sendo preenchidas dinamicamente durante a execução da simulação para atender aos respectivos setores.

**Figura 19 – Propriedades do Agente trabalhador.**

The screenshot shows a software window titled 'Propriedades' (Properties) for an agent type named 'Worker'. The window is divided into several sections. At the top, there's a 'Nome:' (Name) field with 'Worker' entered and an 'Ignorar' (Ignore) checkbox. Below this is a section titled 'Visualização de parâmetros' (Parameter visualization) which contains several input fields for different cycle types: 'TrainingCycles', 'ProductionCycles', 'InspectionCycles', 'FeedbacksCycles', 'StressCycles', and 'thetha'. Each field has a corresponding radio button option: 'Nenhum delimitador' (No delimiter), 'Adicionar separador' (Add separator), and 'Começar seção' (Start section). The 'TrainingCycles' field also has a small icon for adding or removing items. At the bottom of the window, there's a list of categories under the heading 'Ações do agente' (Agent actions), including 'Agente no fluxograma', 'Dimensions and movement', 'Espaço e rede', 'Java avançado', 'Omniverse', 'Avançado', and 'Descrição'.

Fonte: Autoral.

Figura 20 – Propriedades da população de trabalhadores.

The screenshot shows a software window titled "Propriedades" with a sub-header "WorkerPopulation - Worker". The interface includes the following elements:

- Nome:** A text field containing "WorkerPopulation" and two checkboxes: "Exibir nome" (checked) and "Ignorar" (unchecked).
- População:** Radio buttons for "Agente único" (unchecked) and "População de agentes" (checked).
- População:** Radio buttons for "inicialmente vazio" (checked), "Contém um determinado número de agentes" (unchecked), and "Carregado da base de dados" (unchecked).
- TrainingCycles:** A text field with the value "WorkerTrainingCycles".
- ProductionCycles:** A text field with the value "WorkerProductionCycles".
- InspectionCycles:** A text field with the value "WorkerInspectionCycles".
- FeedbackCycles:** A text field with the value "WorkerFeedbackCycles".
- StressCycles:** A text field with the value "WorkerStressCycles".
- thetha:** A text field with the value "0.734".
- Dimensions and movement:** A section with four rows:
  - Comprimento:** Text field "1" and a dropdown menu "metros".
  - Largura:** Text field "1" and a dropdown menu "metros".
  - Altura:** Text field "1" and a dropdown menu "metros".
  - Velocidade inicial:** Text field "triangular(1,2,4)" and a dropdown menu "quilômetros por hora".
- Posição inicial:** A section with:
  - Coloque agente(s):** Radio buttons for "no ponto especificado" (unchecked) and "no nó" (checked).
  - Nó:** A dropdown menu showing "localAgent" with a small icon to its right.
  - Rotação:** A text field "0.0" and a dropdown menu "graus" with a circular arrow icon to its right.
- Bottom tabs:** Three tabs labeled "Estatísticas", "Avançado", and "Descrição".

Fonte: Autoral.


Por serem os agentes centrais da arquitetura ABM, os trabalhadores carregam parâmetros individuais essenciais para o cálculo probabilístico do modelo cognitivo definido anteriormente na Equação 7. Tais parâmetros incluem os Ciclos de Treinamento (*TrainingCycles*), Ciclos de Produção (*ProductionCycles*), Ciclos de Inspeção (*InspectionCycles*), Ciclos de Realimentação (*FeedbackCycles*) e Ciclos de Estresse (*StressCycles*). Os valores iniciais destas variáveis são carregados automaticamente a partir de um banco de dados externo em formato de planilha.

Diferentemente das fôrmas, os trabalhadores possuem mobilidade autônoma. A velocidade inicial de deslocamento desses agentes não é um valor constante, mas sim modelada por meio de uma distribuição probabilística triangular de parâmetros (1, 2, 4) representando a variabilidade da locomoção humana. Neste contexto, o valor 1 define a velocidade mínima, o valor 4 representa a velocidade máxima alcançável, e o valor 2 indica a moda, ou seja, a velocidade de caminhada mais provável e frequente durante a jornada de trabalho. Trabalhadores não têm um ID associado, haja visto que não é necessário identifica-los individualmente.

#### 4.3.1.1 DES no AnyLogic

A abordagem DES foi responsável por definir a representação geométrica do espaço físico, delimitando as fronteiras de atuação dentro do ambiente *Main* do AnyLogic. Para o dimensionamento e o posicionamento espacial dos elementos da simulação, foram utilizados os blocos construtivos *Storage* e *Rectangular Node*. Como mencionado previamente, a disposição espacial foi baseada nas obras do canteiro de obras A.

**Figura 21 – Representação geométrica do cômodo e blocos no ambiente do AnyLogic.**

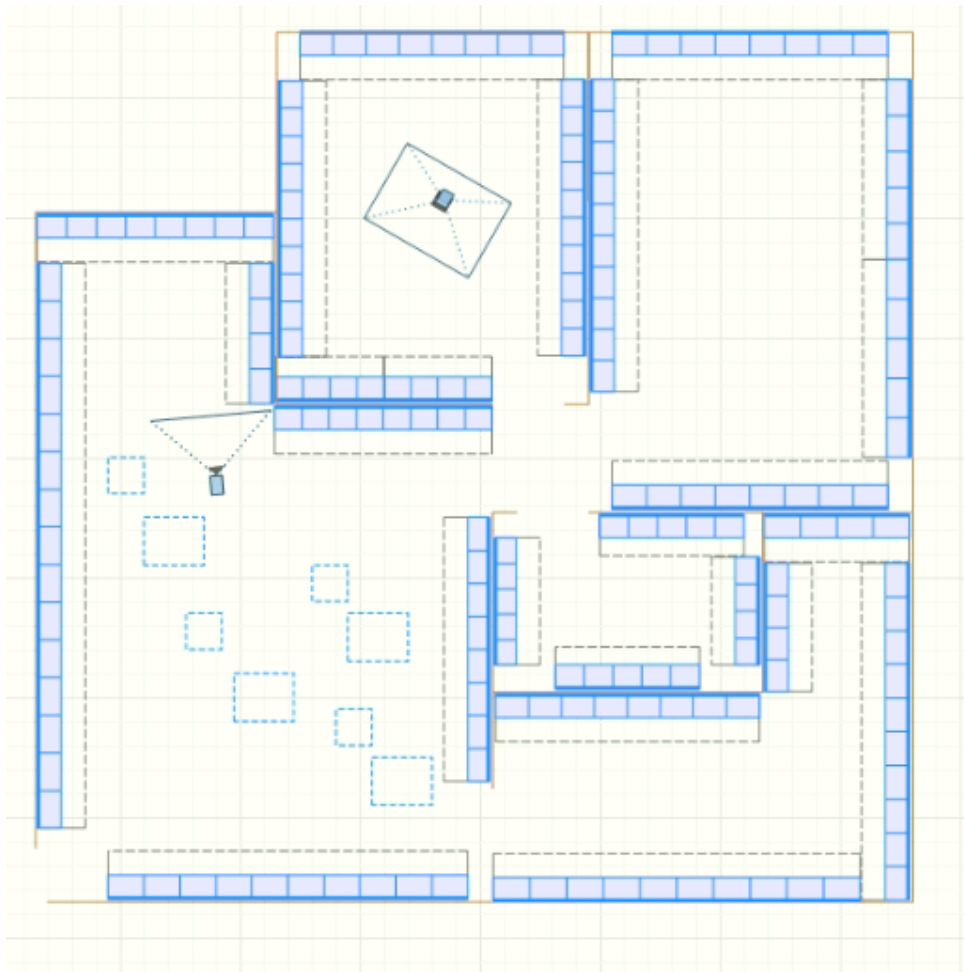


Fonte: Autoral.

Para operacionalizar a movimentação física das fôrmas no ambiente simulado, utilizou-se o elemento *Transporter Fleet* do Anylogic, configurado com o tipo de navegação de espaço livre. O *Transporter Fleet* é um bloco capaz de definir e gerenciar um grupo de transportadores de outros agentes e simular movimentações dentro do software, sendo utilizado para que os trabalhadores movam as fôrmas no canteiro. A capacidade dessa frota foi restrita a apenas dois agentes por cômodo, em estrita conformidade com as observações empíricas realizadas durante a coleta de dados no canteiro. Além de gerenciar a logística, o *Transporter Fleet* atua como a principal ponte de comunicação entre a

modelagem DES e a ABM. Conforme configurado na ação nativa *On Release* (Figura 22), assim que um trabalhador conclui a tarefa de montagem ou desmontagem de um painel, o sistema emite uma mensagem de "finalizado" (*finished*). Essa mensagem é imediatamente capturada e processada pelo diagrama de estados (*Statechart*) do agente trabalhador na ABM, que será visto mais a frente. Ao chegar ao destino final do transporte com "*on destination reached*", ou seja, quando o trabalhador está montando as fôrmas é realizada uma transformação estética nas fôrmas para melhor visualização.

Figura 22 – Propriedades do *Transporter Fleet* com movimentação livre.

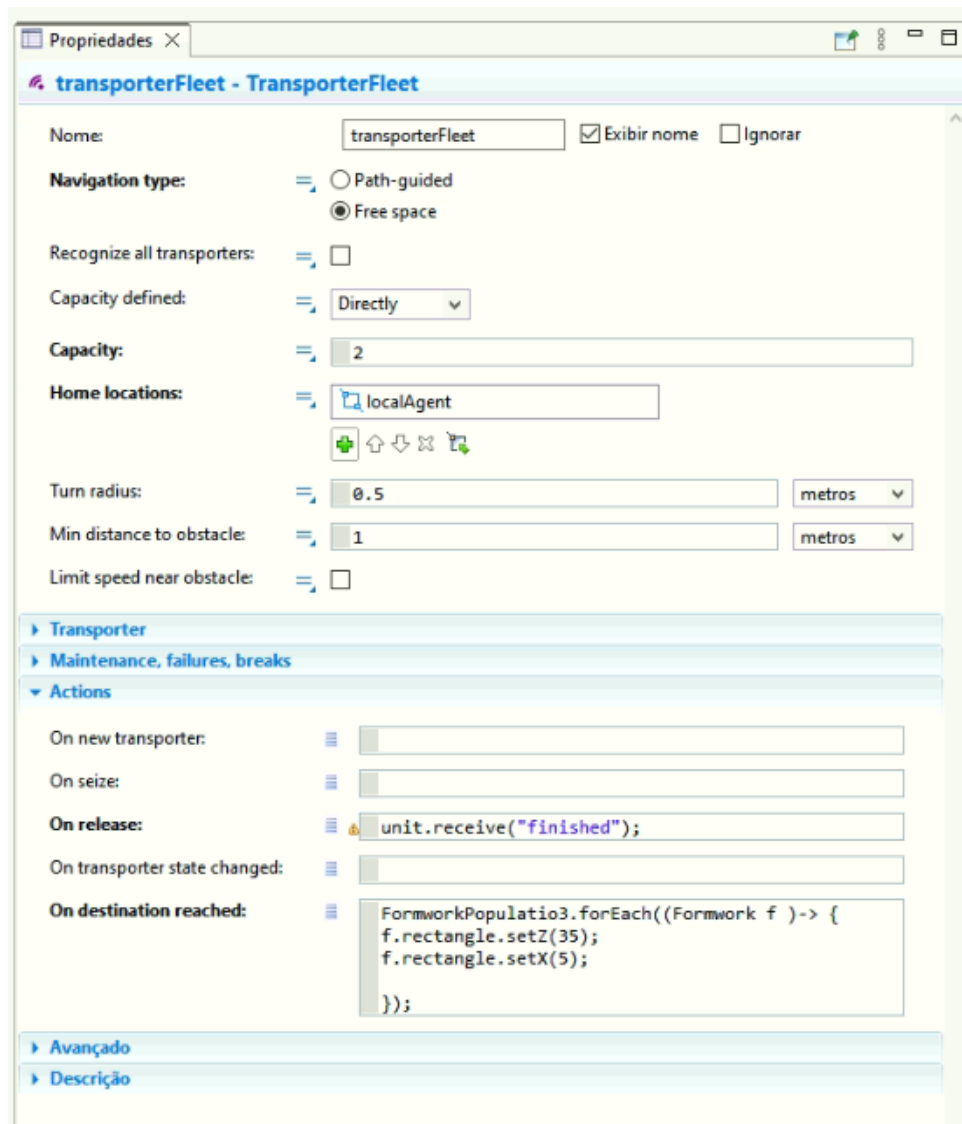


Fonte: Autoral.

A lógica de roteamento da montagem baseada em eventos discretos é estabelecida por uma cadeia de blocos interconectados (Figura 23). Após a inserção da fôrma no sistema pelo bloco *Enter*, aplicou-se um bloco de *Delay* de 1 segundo com o intuito de evitar sobrecarga computacional durante a simulação. Em seguida, o fluxo alcança o bloco *SelectOutputIn*, que atua como o controlador de roteamento. Esse bloco chama a


função *chooseOutput*, a qual é regida por condições lógicas que verificam continuamente a disponibilidade de espaço em cada parede. Uma vez que a capacidade máxima de uma parede é atingida, o fluxo é redirecionado para a próxima, até que a montagem de todo o ambiente seja concluída e as entidades saiam do sistema por meio do bloco *Exit* (Figura 24).

Figura 23 – Conexão dos blocos na lógica de montagem.

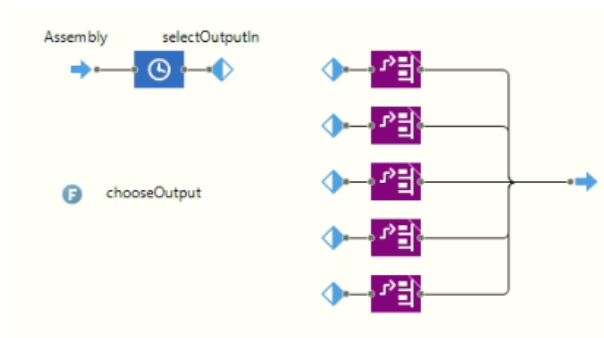

Fonte: Autoral.

Figura 24 – Propriedades lógicas da função *chooseOutput*.

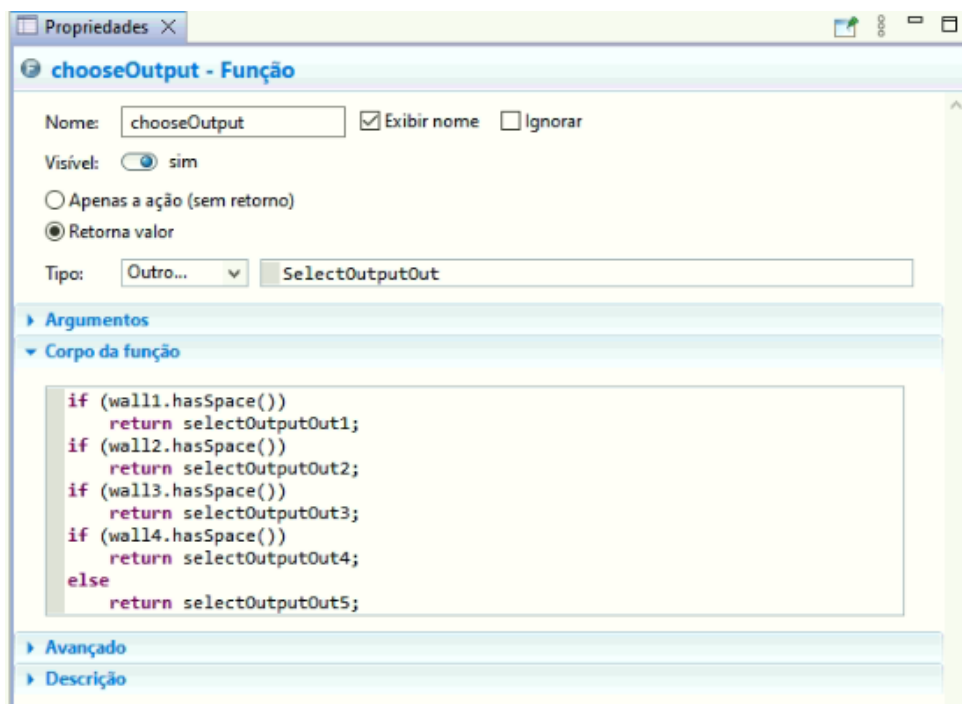

Fonte: Autoral.

Cada componente de montagem atrelado ao bloco *Store* recebe configurações que definem o transportador utilizado, o local de busca da fôrma, o tempo de carregamento (baseado em uma distribuição triangular) e a liberação do trabalhador após a tarefa. O bloco *Store* é utilizado para modelar o armazenamento de itens (agentes) em sistemas de armazenagem, como estantes, prateleiras ou racks.

Figura 25 – Propriedades do bloco de armazenagem *Store*.

The screenshot shows the 'Propriedades' window for the 'store - Store' block. The window is titled 'Propriedades' and has a sub-header 'store - Store'. It contains the following settings:


- Name:** store (text input), with checkboxes for 'Exibir nome' and 'Ignorar'.
- Agents move:** by transporters (dropdown).
- Fleet:** transporterFleet (dropdown).
- Loading time:** triangular( 10, 15, 20 ) (text input), with a unit dropdown set to 'segundo'.
- Pickup location is:** Node (dropdown).
- Node:** localFormwork (dropdown).
- Slotting policy:**
  - ☒ According to storage
  - ☐ Random available
  - ☐ Specific slot
- Storage:** wall1 (dropdown).
- Move agent to:** aisle (dropdown).
- Storing time:** setDelay(agent) (text input), with a unit dropdown set to 'segundo'.

The 'Transporters and resources' section is expanded and contains the following settings:

- Task priority:** 0 (text input).
- Task may preempt:** ☒.
- Task preemption policy:** No preemption (dropdown).
- At transporter downtime agent:** agent waits for original transporter (dropdown).
- After release transporter:**
  - ☐ Returns to current home location
  - ☐ Returns to the nearest home location
  - ☒ Goes to...
  - ☐ Stays where it is
- Destination is:** Node (dropdown).
- Node:** localAgent (dropdown).
- Returns:**
  - ☒ If no other tasks
  - ☐ Each time
- Customize transporter choice:** ☐.
- Dispatching policy:** Nearest to agent (dropdown).

Fonte: Autoral.

O diferencial desta arquitetura híbrida reside na definição do tempo de armazenamento (equivalente ao tempo de montagem ou desmontagem da fôrma). Esse valor não é constante, ele é calculado dinamicamente por meio da função *setDelay*, como mostra a Figura 26. Dentro da ABM, o trabalhador *work* contém uma variável chamada *CountDelay*. A cada etapa realizada pelo trabalhador, essa variável será incrementada com o tempo da etapa realizada. Se o trabalhador fizer pelo menos uma etapa, a flag de *IsNeedDelay* é setada para *True*. Dessa forma, *CountDelay* acumula o tempo de realização das tarefas com base nas etapas executadas ou não executadas pelo trabalhador na ABM. Sendo assim, as decisões tomadas no nível cognitivo do agente refletem diretamente nos atrasos e no tempo físico computado pela DES.

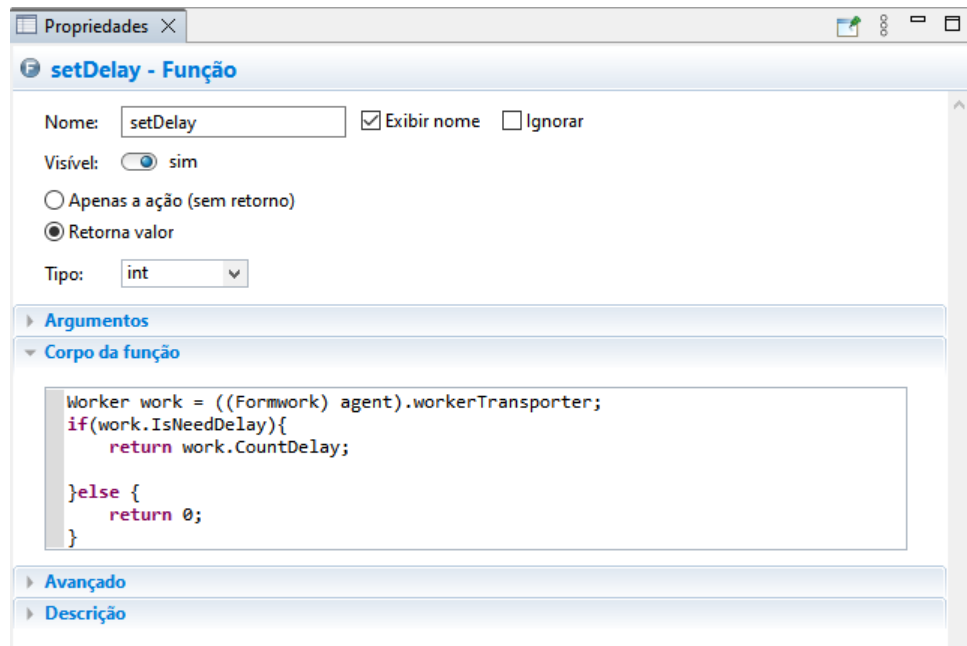Figura 26 – Função *setDelay*.

Fonte: Autoral.

A etapa de desmontagem foi feita de forma similar com a utilização do bloco *Enter*, um bloco *Delay* de 1 segundo e um bloco *Retrieve*. O bloco *Retrieve* é utilizado para remover agentes de um sistema de armazenagem. Destarte, o bloco *Retrieve* realiza diretamente o processo de desmontagem. O bloco também usa a função *setDelay* para retornar o tempo de desmontagem com base no tempo etapas de desmontagem realizadas ou não pelo trabalhador na ABM. Quando as fôrmas são removidas, o trabalhador as leva para a sua locação inicial, completando o ciclo da simulação.

Figura 27 – Conexão dos blocos na lógica de desmontagem.



Fonte: Autoral.

Figura 28 – Propriedades do bloco de desmonte *Retrieve*.

The screenshot shows the 'Propriedades' window for the 'retrieve - Retrieve' block. The window is divided into several sections. The top section contains the block name 'retrieve' and checkboxes for 'Exibir nome' and 'Ignorar'. Below this, there are fields for 'Agents move' (set to 'by transporters'), 'Fleet' (set to 'transporterFleet'), 'Unloading time' (set to 'triangular( 10, 15, 20 )' with a unit of 'segundo'), 'Destination is' (set to 'Node'), and 'Node' (set to 'localFormwork'). The 'Take agent from' field is set to 'aisle', and the 'Retrieving time' field is set to 'setDelay(agent)' with a unit of 'segundo'. The 'Transporters and resources' section includes 'Task priority' (set to 0), 'Task may preempt' (checked), 'Task preemption policy' (set to 'No preemption'), and 'At transporter downtime agent' (set to 'agent waits for original transporter'). The 'After release, transporter' section has radio buttons for 'Returns to current home location', 'Returns to the nearest home location', 'Goes to...' (selected), and 'Stays where it is'. The 'Destination is' field is set to 'Node', and the 'Node' field is set to 'localAgent'. The 'Returns' section has radio buttons for 'If no other tasks' (selected) and 'Each time'. The 'Customize transporter choice' checkbox is unchecked, and the 'Dispatching policy' is set to 'Nearest to agent'. At the bottom, there are tabs for 'Actions', 'Avançado', and 'Descrição', with 'Descrição' currently selected.

Fonte: Autoral.

Para concluir a etapa de DES, foram definidas duas *flags* na função *main*, responsáveis por controlar o estado da simulação: *qAssembly* e *qDisassembly*. Essas variáveis podem assumir valores binários (0 ou 1). Quando *qAssembly* é igual a 0, a simulação encontra-se na etapa de montagem, a qual é considerada finalizada quando essa variável passa a valer 1.

Figura 29 – Variáveis para montagem e desmontagem.




Fonte: Autoral.

Como as etapas são sequenciais, somente após a conclusão da montagem (*qAssembly* = 1) é que se avalia o estado de *qDisassembly*. Nesse caso, se *qDisassembly* for igual a 0, a simulação está na etapa de desmontagem. Quando assume o valor 1, indica que ambas as etapas (montagem e desmontagem) foram concluídas.

#### 4.3.1.2 ABM no AnyLogic

A abordagem ABM foi responsável por descrever o modelo cognitivo do trabalhador. A Figura 30 mostra o diagrama de estados do trabalhador, representando os estados possíveis do trabalhador no processo de montagem e desmontagem. O agente trabalhador inicia no modo Ocioso (*Idle*). É no estado de Locomoção (*Locomotion*) que está a lógica principal do trabalhador, seguido das etapas de montagem à esquerda e etapas de desmontagem à direita. Os últimos Estados definem se o comportamento do trabalhador foi adequado (*AdeqBehaviorA*), concluindo todas as atividades, ou inadequado (*InadeqBehavior*), pulando pelo menos uma atividade.


**Figura 30 – Diagrama de estados na ABM.**

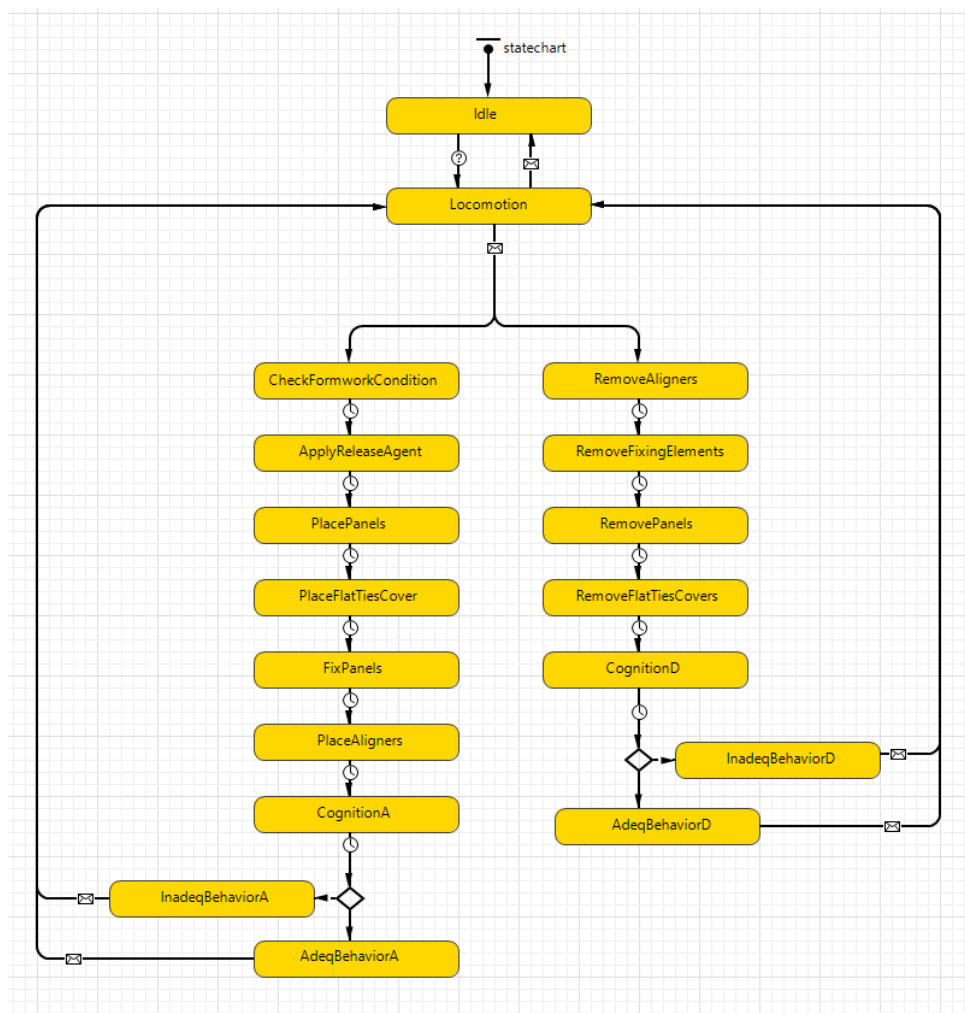

Fonte: Autoral.

A transição para sair do estado Ocioso para o de Locomoção ocorre a partir de um Evento. No Anylogic, Eventos são elementos de modelagem utilizados para agendar e executar ações específicas em momentos definidos ou quando certas condições são atendidas no tempo de simulação.

Figura 31 – Eventos da ABM.

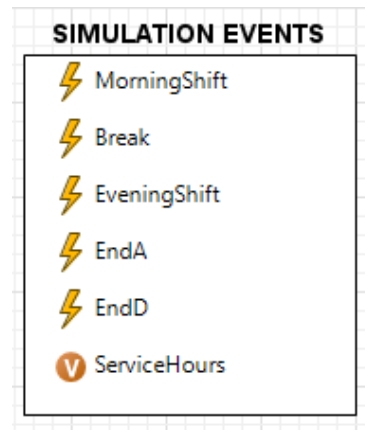

Fonte: Autoral.

No contexto do projeto, o trabalhador sai do modo Ocioso quando as condições de tempo de trabalho são atendidas, ou seja, que foi iniciado o turno do serviço do trabalhador.

Figura 32 – Propriedades dos turnos.

**Propriedades** X

**MorningShift - Evento**

Nome:  ☒ Exibir nome ☐ Ignorar

Visível: ☒ sim ☐ não

Tipo de gatilho:

Modo:

☒ Usar tempo do modelo ☐ Usar datas do calendário

Primeiro tempo de ocorrência (absoluto):

Data de ocorrência:

Tempo de recorrência:

☐ Log da base de dados

**Ação**

**Descrição**

(a) Morning Shift

**Propriedades** X

**EveningShift - Evento**

Nome:  ☒ Exibir nome ☐ Ignorar

Visível: ☒ sim ☐ não

Tipo de gatilho:

Modo:

☒ Usar tempo do modelo ☐ Usar datas do calendário

Primeiro tempo de ocorrência (absoluto):

Data de ocorrência:

Tempo de recorrência:


☐ Log da base de dados

**Ação**

**Descrição**

(b) Evening Shift

Fonte: Autoral.

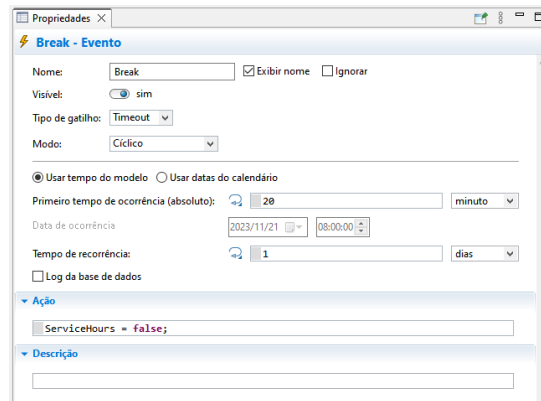**Figura 33 – Propriedade do descanso *Break*.**

The screenshot shows a software window titled "Propriedades" with a sub-header "Break - Evento". The window contains the following fields and options:

- Nome:** A text box containing "Break". To its right are two checkboxes: "Exibir nome" (checked) and "Ignorar" (unchecked).
- Visível:** A radio button labeled "sim" is selected.
- Tipo de gatilho:** A dropdown menu showing "Timeout".
- Modo:** A dropdown menu showing "Cíclico".
- Usar tempo do modelo / Usar datas do calendário:** Two radio buttons. "Usar tempo do modelo" is selected.
- Primeiro tempo de ocorrência (absoluto):** A numeric input box with "20" and a dropdown menu showing "minuto".
- Data de ocorrência:** A date picker showing "2023/11/21" and a time picker showing "08:00:00".
- Tempo de recorrência:** A numeric input box with "1" and a dropdown menu showing "dias".
- Log da base de dados:** An unchecked checkbox.
- Ação:** A section with a dropdown menu showing "ServiceHours = false;".
- Descrição:** A section with an empty text box.

Fonte: Autoral.

#### 4.3.2 Visualização no NVIDIA Omniverse

#### 4.3.3 Diagnóstico de Falhas por Sistemas a Eventos Discretos (SED)

#### 4.3.4 Autômato Gerador do Canteiro de Obras ( $G$ )

#### 4.3.5 Síntese do Autômato Diagnosticador ( $G_d$ )

#### 4.3.6 Análise de Diagnosticabilidade e Impactos na Gestão

## 5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

## **6 CONCLUSÃO**

Retomando o objetivo principal, dizendo que foi alcançado; o que deu certo

### **6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO**

o que deu errado; o que a simulação não cobriu; analisar custo computacional;

### **6.2 INDICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS**

## REFERÊNCIAS

- ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2**: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas abnt. [S.l.], 2014. 46 p. Disponível em: <<http://abntex2.googlecode.com/>>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.
- ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite**: Estilos bibliográficos compatíveis com a abnt nbr 6023. [S.l.], 2014. 91 p. Disponível em: <<http://abntex2.googlecode.com/>>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.
- ADHIKARI, N. et al. A distinctive real-time information for industries and new business opportunity analysis offered by sap and anylogic simulation. In: **2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)**. [S.l.: s.n.], 2021. p. 796–800.
- ALZRAIEE, H.; MOSELHI, O.; ZAYED, T. A hybrid framework for modeling construction operations using discrete event simulation and system dynamics. In: **Construction Research Congress 2012**. American Society of Civil Engineers, 2012. p. 1063–1073. Disponível em: <<https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784412329.107>>.
- American Institute of Aeronautics and Astronautics. **Digital Twin: Definition & Value**. [S.l.], 2020. An AIAA Position Paper. Acesso em: 10 out. 2020. Disponível em: <[https://www.aiaa.org/docs/default-source/uploadedfiles/issues-and-advocacy/policy-papers/digital-twin-institute-position-paper-\(december-2020\).pdf](https://www.aiaa.org/docs/default-source/uploadedfiles/issues-and-advocacy/policy-papers/digital-twin-institute-position-paper-(december-2020).pdf)>.
- AnyLogic. **Multimethod Modeling Environment**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <<https://www.anylogic.com/features/>>.
- ARAÚJO, C. S. **Digital twin system for managing and controlling physical resources during construction activities: application in the concrete walls constructive system**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 2025. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Escola Politécnica. Acesso aberto. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42431>>.
- ARAUJO, L. C.; ABNTEX2. **O pacote abntex2cite**: Tópicos específicos da abnt nbr 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data). [S.l.], 2014. 23 p. Disponível em: <<http://abntex2.googlecode.com/>>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 35 p. Norma técnica.
- BABULAK, E.; WANG, M. Discrete event simulation. In: GOTI, A. (Ed.). **Discrete Event Simulations**. 1. ed. Rijeka: InTech, 2010. p. 1–9.

- BANKS, J. et al. **Discrete-Event System Simulation**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.
- BARBOSA, C. et al. **Testando a utilização de “et al.”**. 2. ed. Cidade: Editora, 2004.
- BASILIO, J. et al. Diagnose de falhas em sistemas a eventos discretos modelados por autômatos finitos. **Sba: Controle e Automação Sociedade Brasileira de Automatica**, v. 21, 10 2010.
- BIANCHI, F.; SQUAZZONI, F. Agent-based models in sociology. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics**, v. 7, n. 4, p. 284–306, 2015.
- CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. **Introduction to Discrete Event Systems**. 2. ed. New York: Springer, 2008.
- CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. **Automation in Construction**, v. 23, p. 3–15, 09 2013.
- CHENG, T. et al. Performance evaluation of ultra wide-band technology for construction resource location tracking in harsh environments. **Automation in Construction**, v. 20, n. 8, p. 1173–1184, 2012.
- CROOKS, A. et al. Agent-based modelling and geographical information systems: A practical primer. In: . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2019. p. 63–77.
- FAKHIMI, M.; MUSTAFEE, N.; ELDABI, T. Hybrid simulation in construction. In: . [S.l.: s.n.], 2023. p. 1397–1408.
- FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020.
- GOOSSENS, M. et al. **The LaTeX graphics companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.
- GRIEVES, M. **Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication**. 2014. White Paper.
- HALPIN, D.; JEN, H.; KIM, J. A construction process simulation web service. In: **Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference**. New Orleans, LA: [s.n.], 2003. p. 1503–1509.
- KECHIDA, S.; DEBBACHE, N. E. Failure diagnosis on discrete event systems. **American Journal of Applied Sciences**, v. 2, n. 11, p. 1547–1551, 2005.
- LAESSGEN, E. H.; STARGEL, D. S. The digital twin paradigm for future nasa and u.s. air force vehicles. In: **53rd Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference: Special Session on Digital Twin**. Honolulu, HI, USA: [s.n.], 2012.
- LU, Y. et al. Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 61, p. 101837, 2020.
- MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.]: IEEE, 2005. p. 14.

- MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 86–98.
- MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. **A Árvore do Conhecimento**: as bases biológicas da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003.
- MITTELBAACH, F. et al. **The LaTeX companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- MUSTAFEE, N. et al. Hybrid simulation studies and hybrid simulation systems: Definitions, challenges, and benefits. In: . [S.l.: s.n.], 2015.
- NUNES, C. E. V. **Sistema Inteligente de Suporte Operacional em Processos de Tratamento Primário de Petróleo**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012. 29 de fevereiro de 2012.
- NVIDIA. **NVIDIA Omniverse**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <<https://www.nvidia.com/pt-br/omniverse/>>.
- OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. **Computers in Industry**, v. 83, p. 121–139, 2016.
- RAMAN, R. Abnormal situation management in process control: Do we have it under control? In: **7th World Congress of Chemical Engineering (WCCE-7)**. Glasgow, Scotland: [s.n.], 2005.
- SACKS, R. et al. Construction with digital twin information systems. **Data-Centric Engineering**, v. 1, n. 14, 2020.
- SICARD, B.; GADSDEN, S. Hybrid modeling for condition monitoring in digital twin systems. In: . [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–5.
- SILVA, J.; SOUZA, J. a. L. **A Inteligência da Complexidade**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2000.
- TAO, F.; ZHANG, M.; NEE, A. Y. C. **Digital Twin Driven Smart Manufacturing**. London, UK: Academic Press, 2019.
- WAMBEKE, B. W.; HSIANG, S. M.; LIU, M. Causes of variation in construction project task starting times and duration. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 137, n. 9, p. 663–677, 2011.
- ZAMANI, V.; YAVARI, E.; TAGHADDOS, H. A science mapping lens on discrete event simulation applications in construction engineering and management. **Automation in Construction**, v. 166, p. 105625, 2024.

## APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

## ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.
